LUMENIS / 序境 • SOURCE-AUDITED PRODUCT RECOVERY

完整产品架构、功能与十五轮闭环任务书

含 44 Screen × 多终端 DESIGN_EXPLORATION 草图（不可直接实现）

不是文件目录汇总，而是从当前源码、调用链、数据库、Permission、Evidence、测试与运行态重新构建的产品地图。

60 CAPABILITIES　40 GAPS　44 SCREENS　225 TASKS　15 CODEX ROUNDS

Baseline: df15a99de6f5ffc3eb85e2c9924afb59c1c3c781 · 2026-09-21

Status: ROUND 01 BASELINE APPROVED · ROUND 02 starts in a new Sol task

EXECUTIVE VERDICT

产品没有整体消失，但远未完成

当前最危险的不是代码数量少，而是“存在”被错误写成“可用/已绑定/已完成”。

Product Skill Store

P0 RESTORE

后端元数据、SQLite、Package Runtime、Execution 与 107 tests 存在；AI-04 却使用旧 FUNCTION_MAP，产品入口和完整生命周期缺失。

44 Screen Truth

P0 CORRECT

44 contracts / 54 bindings / 44 HTTP 200，但只有 6 份 detailed spec 和 6 个 Flutter Screen。bound=true 不是完成证明。

Commercial Surfaces

P0 BUILD

Public Website 与 Web Workspace 均 ABSENT；Desktop/Mobile 仅有六个业务切片。APP ONLY 不再作为目标。

Core Owners

PARTIAL

DB direct sqlite 已收敛到 Shared Database，但 Permission/Evidence/Context/route/compatibility 仍需逐 caller 闭合。

Runtime / CI

LIVE_UNVERIFIED

8201、9223、11434 在运行；当前 HEAD 的 Product/App Gate 未运行，最近尝试在 steps 前失败。

Execution Contract

APPROVED

225 个原 Task 全覆盖到 15 个顺序 Codex 任务。基线已批准；本任务不启动 ROUND 02，也不派发序境09。

ROUND 01 • THREE-WAY TRUTH

远程、本地、PDF 三方对照

当前可执行源码和运行证据高于 PDF 与历史说明；PDF 是任务资产，不是完成证明。

Source	Identity	State	Gap	Disposition
Remote	df15a99de6f5	main	Current HEAD gates NOT RUN	Authority baseline
Local	df15a99de6f5	tracked clean + requested outputs	schedule_state tracked by auto-watch	PROTECT / REVIEW
Runtime	8201 / 9223 / 11434	Flask / CDP / Ollama	business E2E incomplete	LIVE_UNVERIFIED
Original PDF	235 pages	225 tasks	App-first scope	fully mapped + multi-surface delta
Previous PDF	82 pages	text descriptions	no 44-screen drawings	replaced by this source-audited edition

Immutable boundary

READ-ONLY

本 PDF 不覆盖原任务书，不改源码，不提交、不 push。所有实现前必须重新 resolve origin/main、HEAD、worktree、owner/callers 与运行证据。

ONE PRODUCT • MULTIPLE SURFACES

推荐并已获批准的产品架构

Public Website 与 Web Workspace 分离职责；Desktop 保留本地高级执行；Mobile 是 Companion。

PUBLIC WEBSITE

产品/能力/行业/案例/Demo/试用/采购/帮助/登录入口

WEB WORKSPACE

浏览器主操作、真实上下文、任务/结果/Evidence/Decision/Report

DESKTOP POWER CLIENT

Collector/CDP/Cookie/文件/Ollama/长任务/内网/私有部署

MOBILE COMPANION

通知、结果、审批、状态、报告、快速处理

ONE API / VIEWMODEL CONTRACT

SHARED

统一状态语义、Subject / BrandFocus、Permission、Evidence、错误、Return 与 Capability Boundary；不复制业务逻辑。

ONE PRODUCT CORE

CANONICAL

CTH / BMP / AI / Shared / SYSTEM workflows · Canonical Data / Metrics · Agent / Skill / Reporting / Evaluation / Learning

ONE TRUTH & EFFECT LAYER

ONLY-ONE

Database Repository · Evidence · Permission / Approval / Effect Fence · Runtime · Collector · Browser · AI Gateway

MULTI-SURFACE DECISION

技术路线对比

按复用、SEO、浏览器能力、企业权限、维护成本和第二套 Product Truth 风险评估。

Option	Reuse	SEO	Browser limits	Cost	Risk	Decision
Flutter Web 单体	高	弱	Local/CDP 受限	中	官网体验与首屏成本	不作为全部 Web
独立 Web Workspace	合同复用	中	需 Remote boundary	高	第二套状态/逻辑	不单独采用
独立 Public + Flutter Web Workspace	高	强	Desktop 增强	中	性能/URL/a11y	推荐
Public / Workspace 分离部署	Truth 共享	最强	API handoff	中	版本/登录/观测	推荐部署边界

Decision

APPROVED DIRECTION

采用混合路线：独立 Public Website + 以现有 Flutter/Product contracts 为优先复用基线的 Web Workspace；组件复用必须通过浏览器性能、URL、可访问性与安全门。Desktop-only 能力只允许授权发起/查看结果，不在浏览器模拟成功。

SOURCE INVENTORY

当前源码规模与诚实状态

计数来自当前 Tree 与 AST/contract/runtime scan；不按文件名推断完整度。

2,117 Tracked files	**1,017** Python files	**44** Dart files	**800** Route decorators
147 Static table names	**191** Root Python callers	**44** Screen contracts	**6** Detailed specs
6 Flutter screens	**54** Backend bindings	**44/44** Screen HTTP 200	**0** Public/Web product surfaces

Key reading

六个已实现切片、四十四个可返回 builder 与五十四个 pending binding 同时存在；因此当前状态是 PARTIAL，而不是 44 Screen 完成。

RECOVERED FIRST-CLASS CAPABILITY

LUMENIS Product Skill Store

这是本次源码审计确认的关键遗漏：后端资产存在，但产品目录、入口和生命周期没有闭合。

DISCOVER

SkillRegistry / built-ins / shared catalog

INSPECT

publisher · license · I/O · risk · permission

ADMIT

package preview / digest / disabled registration

ENABLE

granted scope / config / account state

VERIFIED RUN

real result / Evidence / history / health

EVOLVE

version / update / disable / uninstall / rollback

CURRENT DEFECT

AI-04 builder currently consumes old function_registry.FUNCTION_MAP (19 functions) instead of canonical SkillRegistry / account skill lifecycle. No Flutter/Web/Mobile Skill Store exists. Round 07 converges backend; Round 14 delivers AI-04; Round 15 releases.

EVIDENCE INDEX

本次实际执行与未执行

测试通过只说明相应范围；CI、完整 44 屏与跨表面 Release 仍未证明。

Area	Scope	Result	Boundary	Status
Governance	6 validators	PASS	current checkout	TESTED
Skill / Agent / AI Task	107 tests	PASS	isolated empty SQLite	TESTED
Flutter	79 tests	PASS	six current slices	TESTED
Screen Runtime	44 endpoints	HTTP 200 / bound=true	not business closure	LIVE_UNVERIFIED
Ollama	qwen3:1.7b / 4b / bge-m3	daemon + inference	derivative only	OPERATING
OpenCode	zhipu/glm route	auth failed	no credential exposed	BLOCKED
GitHub CI	Product/App Gate	current HEAD not run	latest attempt failed pre-step	BLOCKED

防伪：fixture ≠ production • HTTP 200 ≠ business success • provider registered ≠ runtime healthy • missing ≠ 0 • model output ≠ Evidence / Permission / Canonical Truth。

MISSING CAPABILITY REGISTER

缺失 / 风险登记 · 01–08

所有项已进入 15 轮；只在所属 Round/Task Card/owner gate 内实施。

ID	P	Area	Finding	Status	Round	Required change	Acceptance gate
MISS-001	P0	Skill Store	LUMENIS Product Skill Store is not visible or whole	PARTIAL	R07	Converge one catalog/lifecycle owner; preserve built-ins/custom/MCP/module behavior; add Web/Desktop/Mobile role	Discover→inspect trust/license/I-O/permission→enable→verified run→history→update/disable/uninstall; honest health
MISS-002	P0	Experience Truth	All 44 runtime screens report bound=true despite only six implemented screens/specs	PARTIAL	R08	Make bound/readiness derive from verified owner/scope/action/evidence and actual surface availability	Unimplemented/blocked fields never report ready/bound; runtime and registry agree
MISS-003	P0	Web Workspace	Commercial browser workspace absent	ABSENT	R08	Create approved Flutter Web Workspace shell over canonical API/ViewModel after Round 08 gate	Browser login/context/task/result/Evidence works without local-only capability simulation
MISS-004	P0	Public Website	Commercial website absent	ABSENT	R08	Implement separate presentation/acquisition surface: product, CTH/BMP/Shared/SYSTEM, cases/demo, trial/contact/help/login	SEO/accessibility/performance + real trial/contact/workspace-entry journey; no production truth
MISS-005	P0	Permission	Per-screen READ actor/domain/Subject/BrandFocus permission largely missing	PARTIAL	R04	Bind trusted actor and target scope through existing Permission owner; fail closed	Unauthorized cross-scope reads denied and audited; UI denial distinct
MISS-006	P0	Evidence	Shared Evidence reads are globally scoped and duplicate stores remain	PARTIAL	R04	Converge read contracts and actor/domain/object lineage without rewriting source facts	Every claim/action traces to immutable source and Return; no cross-scope leakage
MISS-007	P0	Product context	Authorized Subject/BrandFocus does not propagate through all workflows	PARTIAL	R04	One server-authorized context contract shared by Web/Desktop/Mobile	Context selection cannot grant access; task/history/report all retain scope
MISS-008	P0	Action closure	Most declared UI actions have no verified API/Permission/effect/Evidence contract	PARTIAL	R04	Resolve one action at a time through existing owner/firewall/fence	Decision→approval→idempotent effect→result→Evidence→rollback

MISSING CAPABILITY REGISTER

缺失 / 风险登记 · 09–16

所有项已进入 15 轮；只在所属 Round/Task Card/owner gate 内实施。

ID	P	Area	Finding	Status	Round	Required change	Acceptance gate
MISS-009	P0	CI	No passing Product/App Gate for current HEAD	BLOCKED	R15	Repair runner/account/infrastructure and execute current-head blocking gates	Current SHA has complete logs and green required jobs; Tier C remains separate
MISS-010	P0	Release	No clean-clone/cross-platform/Internal Beta evidence	ABSENT	R15	Build/install/test Windows/macOS/Linux/Android/iOS as applicable with rollback	Release manifest ties source/schema/tests/artifacts/live evidence
MISS-011	P0	Security	Sensitive default account/recovery bootstrap material is hardcoded in source	BLOCKED	R04	Remove fixed secret material through approved migration/recovery design without blocking pre-beta	No plaintext/default personal secret; upgrade/migration/recovery tested
MISS-012	P0	Runtime output	Mutable Collector schedule state is tracked inside the source tree	EXISTS_BUT_UNSCOPED	R05	Move future runtime state to canonical operational storage; preserve current behavior/data until owner and migration are approved	Read endpoints do not mutate source tree; operational state survives/recoverable without auto-committing runtime changes
MISS-013	P0	AI Gateway	Provider status endpoints contradict each other	PARTIAL	R07	One provider state machine and one contract across AI-01/AI-05	Same check time/provider/model/fallback yields consistent honest state
MISS-014	P0	AI API	Duplicate /api/ai/tasks ownership	PARTIAL	R07	Choose canonical route; adapt callers; preserve behavior/tests before removal	Only one effective route owner; OpenAPI/runtime/callers agree
MISS-015	P0	44 screen delivery	38 screens lack detailed specs and Flutter implementation	ABSENT	R09	Complete purpose-built spec then Web/Desktop/Mobile composition per scheduled round	Each screen passes field/action/state/surface/accessibility/runtime gates
MISS-016	P1	Desktop capability boundary	Web cannot express local Collector/CDP/Cookie/Local AI task handoff	ABSENT	R08	Expose truthful capability availability and authorized desktop/remote task handoff	Web never simulates local success; Desktop result returns to Web

MISSING CAPABILITY REGISTER

缺失 / 风险登记 · 17–24

所有项已进入 15 轮；只在所属 Round/Task Card/owner gate 内实施。

ID	P	Area	Finding	Status	Round	Required change	Acceptance gate
MISS-017	P1	Mobile Companion	Notification/approval/report/light-action product flow absent	ABSENT	R14	Implement companion roles over same contracts	Mobile notification→evidence→approve/deny→result→return
MISS-018	P1	Jev	Approved typed provider has no implementation	ABSENT	R07	Implement behind one gateway with typed schema, confidence, shadow eval, cost/legal/privacy and rollback	Never writes truth/effects; low-confidence path explicit; benchmark accepted
MISS-019	P1	Learning	Continuous learning exists but promotion/rollback is not product-closed	PARTIAL	R07	Close feedback→evaluation→versioned asset→shadow→approval→promotion→observe/rollback	Version and provenance visible; no autonomous truth/permission rewrite
MISS-020	P1	Reporting	Report/export paths are multiple and user workflow incomplete	PARTIAL	R07	Converge owner and artifact lifecycle; preserve CTH/BMP semantics	Scoped preview/export/download with definitions, evidence and audit
MISS-021	P1	Collector live acceptance	XHS/session/CDP presence not full acquisition proof	LIVE_UNVERIFIED	R06	Run approved live gate without exposing secrets	Source→capture→Evidence→canonical with rate/risk/recovery and truthful no-data
MISS-022	P1	Database release	Live WAL blocks ordinary protected-seed test copy; backup/migration/rollback not accepted	BLOCKED	R15	Use approved external consistent snapshot/backup path; never stop or checkpoint silently	Consistent backup, forward migration, rollback and data integrity evidence
MISS-023	P1	Governance drift	Product positioning previously described app-only endpoints	TESTED	R02	Preserve the approved four-surface wording; implementation remains assigned to its scheduled rounds	Current authorities and validators state four surfaces consistently; absent runtime surfaces are not reported as implemented
MISS-024	P1	Launch path drift	Launch plan previously referenced the broader D:\LUMENIS_REBUILD path	TESTED	R02	Preserve the canonical path and subordinate launch-gate role	All launch/runbooks resolve the canonical repository and actual entrypoint

MISSING CAPABILITY REGISTER

缺失 / 风险登记 · 25–32

所有项已进入 15 轮；只在所属 Round/Task Card/owner gate 内实施。

ID	P	Area	Finding	Status	Round	Required change	Acceptance gate
MISS-025	P1	Binding registry freshness	54-row registry generated from old SHA	PARTIAL	R01	Re-resolve every affected row when its round begins; do not blanket mark verified	Row includes current SHA/owner/callers/permission/evidence/tests/runtime
MISS-026	P1	Function map	Legacy function_map.json has 11/30 statically unmatched endpoint claims	PARTIAL	R02	Verify runtime url map/callers; preserve unique behavior; absorb or label obsolete	Every catalog function resolves to one current callable or explicit blocked/retired record
MISS-027	P1	CTH external data	Footfall/member sales/MDM relationships unavailable	BLOCKED	R09	Integrate only approved POS/CRM/MDM contracts; keep NOT_COLLECTED	No missing→0; source/period/owner and permission visible
MISS-028	P1	CTH closed loop	Case/decision/action/outcome is not executable in surfaces	PARTIAL	R11	Close source-backed case/risk/decision/action/outcome/report chain	Real permitted action and outcome evaluation with Evidence lineage
MISS-029	P1	BMP closed loop	Market→creator/content→campaign→evaluation not executable in surfaces	PARTIAL	R12	Close BrandFocus-scoped workflow	Real plan/content/campaign result/evaluation with source lineage
MISS-030	P1	Content studio	SH-01 current App is catalog-only, not a creation studio	PARTIAL	R09	Implement brief/evidence/editor/version/review/approval/artifact path	Real artifact with citations, version, approval and outcome
MISS-031	P1	Podcast	Backend/store exists but no product studio	PARTIAL	R13	Implement audio-first source/timecode/version workflow	Rights/source review and versioned export accepted
MISS-032	P1	Internal browser	SYS-06 product capture workspace absent	PARTIAL	R14	Implement controlled evidence capture, not personal browser	Allowed navigation→capture→Evidence→audit/return

MISSING CAPABILITY REGISTER

缺失 / 风险登记 · 33–40

所有项已进入 15 轮；只在所属 Round/Task Card/owner gate 内实施。

ID	P	Area	Finding	Status	Round	Required change	Acceptance gate
MISS-033	P1	Notifications/tasks	SH-06 and Mobile task/approval inbox absent	EXISTS_BUT_UNSCOPED	R14	Add actor-scoped inbox with origin/return	No cross-scope task leakage; actions permissioned and reversible
MISS-034	P1	Knowledge assets	Resource/intelligence/case libraries lack one current authority and complete entry points	PARTIAL	R11	Classify operational vs provenance; expose only verified assets	Each asset has owner/version/source/review status and no duplicate truth
MISS-035	P1	OpenCode engineering	Configured provider fails authentication	BLOCKED	R01	Repair user-level provider auth outside product source; re-test read-only	Bounded read-only command succeeds without exposing credential
MISS-036	P2	Accessibility	No complete keyboard/screen-reader/reduced-motion/device matrix	PARTIAL	R15	Per-screen surface acceptance	WCAG/platform checks plus real device evidence
MISS-037	P2	Localization	Three-language coverage and long-text layouts incomplete	PARTIAL	R08	Complete copy ownership and pseudo/long-text acceptance	No truncation/meaning drift across applicable screens/surfaces
MISS-038	P2	Performance/long-run	No current release-grade long-run evidence	ABSENT	R15	Measure web/desktop/mobile/runtime/collector/AI under realistic loads	Budgets and recovery accepted for current SHA
MISS-039	P2	Public commercial funnel	Trial/contact/help/case/demo/enterprise purchase funnel absent	ABSENT	R08	Define truthful content and CRM/contact handoff without product data ownership	Public→trial/contact/login path works and privacy/analytics are approved
MISS-040	P2	API/OpenAPI parity	Static route volume and compatibility paths exceed current canonical contract	PARTIAL	R02	Generate canonical API truth from active app and verify consumers	One operation/owner/schema/error/state per consumer route

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 · 01–08

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-001	Governance	One Product / Only-One owners	Sol + canonical owner index	Blocking validators and owner index	PARTIAL	R02	Authority is defined, but current positioning/launch docs still drift.
CAP-002	Surfaces	Public Website	Public presentation surface; no truth owner	No website root, HTML/CSS product surface or deploy config	ABSENT	R08	Commercial product, demo, trial/contact/help and workspace entry are missing.
CAP-003	Surfaces	Web Workspace	Flutter operational Experience over Product Core	No Flutter web target or browser deployment	ABSENT	R08	Commercial primary browser workspace is missing.
CAP-004	Surfaces	Desktop Power Client	Flutter App + SYSTEM local capabilities	Six Flutter workflow slices; Windows/macOS/Linux targets exist	PARTIAL	R08	Only six of 44 screens; no release/device evidence.
CAP-005	Surfaces	Mobile Companion	Flutter mobile composition	Responsive code for six slices; Android/iOS targets exist	PARTIAL	R08	Notification/approval/report companion is not implemented end to end.
CAP-006	Experience	44 screen contract set	Experience Constitution	44 contract directories, 132 JSON files; 54 binding rows	PARTIAL	R08	Only six detailed specs and six Flutter screens; bound flag overstates readiness.
CAP-007	Experience	Purpose-built UI/UX specifications	Experience Constitution + per-screen specs	44 one-row blueprints; six detailed specs	PARTIAL	R08	38 detailed specs and executable sketches are absent from source.
CAP-008	Experience	Localization / accessibility / motion	Experience foundation	i18n deltas, Flutter semantics/reduced motion in current slices	PARTIAL	R08	No full 44-screen/4-surface accessibility and locale acceptance.

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 · 09–16

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-009	Core	Account identity and recovery	SYSTEM / Account	v4 account tables/routes, recovery, TOTP, device/member/approval APIs	PARTIAL	R04	Post-beta product decision deferred; source contains sensitive bootstrap defaults requiring remediation.
CAP-010	Core	CTH Subject Context	CTH Product Core	subject_context.py + subject_registry.py + runtime identity	PARTIAL	R04	Read permission and external MDM/association data remain incomplete.
CAP-011	Core	BMP BrandFocus	BMP Product Core	domain context/brand sources and BMP builders	PARTIAL	R04	Authorized BrandFocus propagation and live workspace selection are incomplete.
CAP-012	Core	Permission / approval	SYSTEM Security	PermissionGate with operation/risk/role/domain decisions and approvals	PARTIAL	R04	Optional global Basic auth is not per-screen actor/target permission.
CAP-013	Core	Action Firewall / Effect Fence	SYSTEM Security	validate_action + idempotent staging reservations	PARTIAL	R04	Most Experience actions are declarations without verified write/effect contracts.
CAP-014	Core	Shared Evidence	Shared Evidence	app_evidence_records + chain/manual/API + replay DLQ	PARTIAL	R04	Actor/domain/object read scope and owner convergence are incomplete.
CAP-015	Core	Canonical Data	Product Core	canonical_data.py plus evidence-chain canonical table and business/platform schemas	PARTIAL	R03	Canonical writers/readers and dual representations require closure.
CAP-016	Core	Metrics / Truth Table / ViewModel	Product Core + Shared	canonical_metrics.py, ui_view_model.py, viz providers, screen builders	PARTIAL	R03	Definitions, missing-state semantics and source timestamps are not consistent across all screens.

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 · 17–24

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-017	Core	Database repository / migrations	Shared Database	Exclusive direct sqlite owner in connection.py/migrations.py	TESTED	R03	Production migration/rollback and schema convergence remain Round 15 gates.
CAP-018	Core	API truth / composition	Product Core app.py + registered blueprints	800 static route decorators; app.py and many compatibility blueprints	PARTIAL	R02	Route ownership and generated OpenAPI/current runtime parity are not closed.
CAP-019	Runtime	Startup / supervisor / health	SYSTEM Runtime	start_production.ps1, run_supervised.py, /healthz	LIVE_UNVERIFIED	R05	Health payload is shallow and not full dependency readiness.
CAP-020	Runtime	RuntimeGuardian / queue / DLQ	SYSTEM Runtime	runtime_guardian.py and collector guard queues	PARTIAL	R05	Recovery and long-run worker behavior need live acceptance.
CAP-021	Runtime	Recovery / self-repair	SYSTEM Runtime	auto_recovery, self_repair, full_self_repair, guardians	PARTIAL	R05	One recovery owner and tested failure/return path not proved.
CAP-022	Runtime	Observability / logs / traces	SYSTEM Runtime	monitoring/logger/ai traces/guardian metrics	PARTIAL	R05	Ready state is not backed by end-to-end correlated trace acceptance.
CAP-023	Runtime	Settings / module customization	SYSTEM Settings	module_registry + account nav + settings routes	EXISTS_BUT_UNSCOPED	R14	Useful module/store controls exist but are not surfaced and persistence ownership is split.
CAP-024	Acquisition	Collector orchestration	SYSTEM Collector	collector runtime, adapters, scheduler, guards	PARTIAL	R06	One runtime owner is declared; live pipeline and compatibility parity remain open.

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 · 25–32

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-025	Acquisition	Scheduler / rate limit / risk guard	SYSTEM Collector	policy/decider/planner/gate + risk/resource guards	PARTIAL	R06	Mutable runtime state is now tracked inside the source tree; operational ownership and read-side-effect risk require resolution.
CAP-026	Acquisition	Multi-platform adapters	SYSTEM Collector	XHS, Weibo, Bilibili, Douyin, channels, public web and global platforms	PARTIAL	R06	Adapters exist at different maturity; registration is not live capability.
CAP-027	Acquisition	Public HTTP / RSS / Atom / Sitemap	SYSTEM Collector	public_source/public_http/web_rss/web_atom/sitemap	IMPLEMENTED	R06	No Web Workspace source-management UX and no release live matrix.
CAP-028	Acquisition	XHS / RedNote acquisition	SYSTEM Collector + Browser	xhs client/collector/live engine, cookie bridge, CDP collector, HK policy	LIVE_UNVERIFIED	R06	Cookie/session, 300012, provenance and no-new-data must pass live gate.
CAP-029	Acquisition	Browser / CDP runtime	SYSTEM Browser	router/policy/contract + CDP/Playwright adapters	LIVE_UNVERIFIED	R06	Resident browser does not prove safe capture, recovery or return.
CAP-030	Acquisition	Cookie / session / auth recovery	SYSTEM Browser/Collector	cookie vault/bridge, browser session, recovery center	PARTIAL	R06	Must preserve platform identity separation and prove recovery without exposing secrets.
CAP-031	AI	One AI Gateway	SYSTEM AI Gateway	core/channel/providers with compatibility callers	PARTIAL	R07	Provider-state semantics and duplicate callers are not converged.
CAP-032	AI	Ollama local AI	SYSTEM AI Gateway provider	core auto-detects Ollama; qwen/bge models installed	OPERATING	R07	Daemon/model are real; user workflow, fallback and Evidence acceptance remain partial.

产品能力源码矩阵 • 33–40

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-033	AI	Zhipu cloud provider	SYSTEM AI Gateway provider	Gateway code/env contract exists	LIVE_UNVERIFIED	R07	Current live status, cost/privacy/fallback and product use not verified; no credential is included.
CAP-034	AI	Jev typed decision/evaluation provider	SYSTEM AI Gateway candidate	Governance-approved boundary only; no adapter	ABSENT	R07	Implementation, legal/cost/privacy, shadow eval, confidence handling and rollback absent.
CAP-035	AI	AI task engine	Shared Agent/SYSTEM execution	create/parse/permission/execute/verify/approve/cancel + task/evidence/trace tables	TESTED	R07	Current API owner and business-scope propagation need convergence.
CAP-036	Agents	Agent runtime / delegation / memory	Shared Agent runtime	adapters, agent groups/capabilities/smart tools/memory	PARTIAL	R07	Multiple runtime/capability paths and no canonical user workbench closure.
CAP-037	Agents	LUMENIS Product Skill Store	Shared Agent Skill Registry	SkillMetadata registry + SQLite skills_registry + package preview/register/activate + MCP execution/history	PARTIAL	R07	P0 preserve/restore: backend exists but catalog truth, lifecycle, trust, update/uninstall, health and product UX are split/missing.
CAP-038	Agents	External Skill/MCP package admission	Shared Agent Skill package runtime	GitHub/local/zip/SKILL.md/MCP metadata preview and bounded call	TESTED	R07	Publisher/license/signature/scanning/update/uninstall and runtime isolation gates incomplete.
CAP-039	Agents	Function and module catalogs	Compatibility callers to canonical registries	FUNCTION_MAP/VIZ_FUNCTIONS/module registry/SHARED_SKILL_CATALOG	PARTIAL	R07	Must absorb unique behavior into one capability truth without losing module customization.
CAP-040	Shared	Content creation	Shared Creation	content_generation + shared skill catalog + artifact flow	PARTIAL	R07	No complete editor/version/review/publish workflow.

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 · 41–48

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-041	Shared	Podcast production	BMP/Shared	podcast_routes + podcast_store + shared skill	PARTIAL	R13	Audio/transcript/source/version/export workflow absent in surfaces.
CAP-042	Shared	Reporting / export	Shared Reporting	engine/routes/export/artifact/word_pdf	PARTIAL	R07	One report owner, scoped export, audited artifact retrieval and formats not closed.
CAP-043	Shared	Evaluation	Shared Evaluation	runner/dimensions/recorder/trajectory/benchmark	PARTIAL	R07	Promotion and cross-domain evaluation semantics need closure.
CAP-044	Shared	Learning loop	Shared Learning	feedback/collector/loop/memory/operations/persistence	PARTIAL	R07	Continuous learning exists in code but promotion/rollback/observability UI is incomplete.
CAP-045	Shared	Knowledge / resource / case libraries	Shared + domain owners	resource_library, intelligence_library, case libraries/templates	PARTIAL	R11	Current vs historical authority and product entry points are not fully classified.
CAP-046	Shared	Notifications / task inbox	SYSTEM TaskEngine + adapters	alert engine, notifier, task queues	EXISTS_BUT_UNSCOPED	R14	Actor-scoped inbox and mobile notification/approval experience absent.
CAP-047	CTH	Monitoring / events / sentiment / trend	CTH	notes/events/trend/risk/calendar/negative modules and screen builders	PARTIAL	R10	Real source lanes, freshness, event graph and per-screen E2E not closed.
CAP-048	CTH	Case → Insight → Decision → Action → Outcome	CTH + Shared/SYSTEM effects	case/PR/risk/review/action/effect modules	PARTIAL	R11	Core commercial closed loop not proven end to end.

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 • 49–56

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-049	CTH	CTH reports / weekly brief	CTH + Shared Reporting	daily/weekly/report engine + evidence exporter	PARTIAL	R11	Artifact preview/export/retrieval and source trace incomplete.
CAP-050	BMP	Portfolio / competitors / market intelligence	BMP	brand directories/knowledge/market discovery and builders	PARTIAL	R12	Authorized focus, comparable metrics and market evidence not closed.
CAP-051	BMP	Propagation / campaign	BMP	brand_propagation + topic_campaign/snapshot	PARTIAL	R12	Metric definitions, windows, actual-vs-goal and outcome closure incomplete.
CAP-052	BMP	Creator ecosystem / KOS/KOL/KOC/UGC	BMP	kos engine/attribution/metrics/paid/routes	PARTIAL	R12	Identity, authenticity, paid effects and dossier UX need convergence.
CAP-053	BMP	Content lifecycle	BMP + Shared Creation	content generation/center modules	PARTIAL	R13	Product workflow and rights/effect boundary not surfaced.
CAP-054	BMP	Evaluation / risk / benchmark	BMP + Shared Evaluation	brand evaluation/risk/benchmark builders and functions	PARTIAL	R13	Comparable baseline, confidence and evidence drill-down absent.
CAP-055	Delivery	Security / compliance	SYSTEM Security	security scanner/boundary/compliance/permission/effect	PARTIAL	R15	Credential bootstrap, external packages and full release security acceptance remain.
CAP-056	Delivery	CI test tiers	SYSTEM Release	Tier A/B/C manifests and workflows	BLOCKED	R15	No green current-head CI or Tier C release evidence.

SOURCE-LEVEL CAPABILITY MAP

产品能力源码矩阵 · 57–60

Owner → implementation → callers/contract → data → Permission → Evidence → tests → runtime → compatibility。

ID	Area	Capability	Owner	Implementation	Status	R	Gap
CAP-057	Delivery	Packaging / clean clone / rollback	SYSTEM Release	deployment/scripts/targets exist	ABSENT	R15	Windows/macOS/Linux/Android/iOS build and clean-clone evidence missing.
CAP-058	Delivery	Compatibility caller convergence	Per canonical owner	191 root Python callers classified historically	PARTIAL	R02	Current HEAD has 191 root callers; unique behavior must be preserved before removal.
CAP-059	Delivery	External business data dependencies	CTH/BMP owners	Explicit not-collected fields and blocked bindings	BLOCKED	R09	Several promised business outcomes cannot be real until approved external sources exist.
CAP-060	Delivery	Engineering AI tools	Codex engineering layer	Codex active; OpenCode configured; Ollama available	PARTIAL	R01	OpenCode is currently unusable due to authentication failure; this is an engineering config issue, not product capability.

FIFTEEN SEQUENTIAL CODEX TASKS

十五轮主表 • ROUND 01–05

一轮 = 一个独立 Codex 任务；本任务验收并停止后，用户才决定下一任务。

R01	**Current Truth / PDF Full Coverage** Freeze current remote/local/runtime/PDF truth and protect unknown work.	PDF p.11–14 • 4 tasks	Remote/local/PDF/source/runtime evidence agree; 235 pages and 225 tasks mapped; no source mutation.
R02	**Authority / Only-One / Compatibility** One current product authority, four approved surfaces, named owner for every caller/capability.	PDF p.15–16, 30 • 3 tasks	No App-only drift, duplicate authority or unowned compatibility deletion; Skill Store preserved as a name d capability.
R03	**Database / Canonical Truth** One DB path/repository/schema truth with isolated tests and protected production data.	PDF p.17 • 1 tasks	Canonical paths/writers and rollback proof; no production DB mutation by tests.
R04	**Identity / Context / Permission / Evidence** Trusted actor + Subject/BrandFocus + scoped reads/writes/effects + lineage.	PDF p.18–22 • 5 tasks	Context never grants authorization; every decision/action traces to Evidence and Return.
R05	**Runtime / Health / Recovery / Observability** Honest startup, dependency health, worker/queue/DLQ, recovery and trace.	PDF p.27–28 • 2 tasks	Failure→diagnosis→authorized recovery→Return passes with no source-tree runtime writes.

FIFTEEN SEQUENTIAL CODEX TASKS

十五轮主表 • ROUND 06–10

一轮 = 一个独立 Codex 任务；本任务验收并停止后，用户才决定下一任务。

R06	**Collector / Browser / Acquisition**	One authorized acquisition chain from source/session to Evidence and Canonical Data.	**PDF p.25–26 • 2 tasks** Rate/session/provenance/recovery pass; no second collector/browser.
R07	**AI / Agent / Skill Store / Shared Engines**	One Gateway and Agent runtime; restore full Skill Store; reporting/evaluation/learning remain derivative and governed.	**PDF p.23–24 • 2 tasks** Provider state honest; Skill lifecycle verified; Jev staged; AI never owns truth/effects.
R08	**Cross-Surface Experience Foundation**	Public Website + Web Workspace + Desktop + Mobile roles over one Product Core.	**PDF p.31–34 • 4 tasks** Four distinct surfaces share contract/state/Permission/Evidence; local-only boundaries explicit; no template product.
R09	**Golden Pages + CTH-02**	AI-01, CTH-01/02, BMP-01, SH-01, SYS-01 become real cross-surface workflows.	**PDF p.35, 52–59, 92–95, 136–139, 156–159, 188–191 • 25 tasks** Applicable Web/Desktop/Mobile flow returns real scoped data/result/Evidence; external gaps remain honest.
R10	**CTH Monitoring / Analysis**	CTH-03..07 source-backed live monitoring, event relations, calendar, feedback and trends.	**PDF p.60–79 • 20 tasks** Subject-scoped sources, freshness, Evidence Trace and responsive acceptance pass.

FIFTEEN SEQUENTIAL CODEX TASKS

十五轮主表 · ROUND 11–15

一轮 = 一个独立 Codex 任务；本任务验收并停止后，用户才决定下一任务。

R11	**CTH Case / Risk / Decision / Report**	CTH-08..10 close Case→Insight→Decision→Action→Outcome→Report.	**PDF p.80–91 • 12 tasks** Authorized action/outcome and report lineage are executable and auditable.
R12	**BMP Portfolio / Market / Propagation / Creator**	BMP-02..05 close BrandFocus→market→propagation→creator evidence.	**PDF p.96–111 • 16 tasks** Brand scope, comparable definitions and creator ownership evidence pass.
R13	**BMP Content / Campaign / Podcast / Evaluation**	BMP-06..11 close asset/campaign/podcast/result/evaluation/risk/benchmark.	**PDF p.112–135 • 24 tasks** Rights, approval, effect, actual result and aligned evaluation are traceable.
R14	**Remaining ACC / AI / Shared / SYSTEM**	Deliver ACC-01..04, AI-02..05, SH-02..06, SYS-02..08 with honest deferrals.	**PDF p.36–51, 140–155, 160–187, 192–211 • 80 tasks** Each surface role and state is explicit; account timing honored; no hidden local capability in Web.
R15	**Closed-loop Internal Beta / Clean Clone / Release**	Public→Web→real context/workflow/Evidence→Desktop execution→Web result→Mobile approval→Report/Evaluation/Learning.	**PDF p.29, 212–235 • 25 tasks** Current-SHA cross-surface real-data release evidence and final unresolved list accepted by Sol/PO.

ROUND 15 TARGET JOURNEY

跨表面真实闭环

每一步必须保留 actor、context、Permission、Evidence、state、Return 与错误恢复。

01 • Public

了解 / Demo / 试用

02 • Web

登录 / Subject / BrandFocus

03 • Workflow

任务 / 内容 / 决策

04 • Evidence

Trace / Source / Lineage

05 • Desktop

CDP / Collector / Local AI

06 • Web

结果 / 报告 / Return

07 • Mobile

通知 / 审批 / 快速处理

08 • Learning

评价 / 版本 / Promotion

Release Gate

NO FALSE GREEN

真实 permitted data · PC/Mobile/Web · failure/recovery · security · accessibility · performance · Tier A/B/C · clean clone · packages · rollback · final unresolved list。

PUBLIC-01 • 品牌首页

非设计权威、不可直接实现。商业官网只承载产品叙事、可信 Demo 与转化入口。

序境 LUMENIS

产品 · 行业 · 案例 · 帮助 · 登录　申请试用

一句话价值与双 CTA

了解产品 → 看 Demo → 申请试用 / 登录

主要行动　查看可信证据

One Product 闭环图

结构化示意 / 交互式 Demo，不伪造客户或结果。

One Product 闭环图

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

CTH/BMP/AI/Shared/SYSTEM 能力索引

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

Evidence/Permission 信任说明

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

了解产品 → 看 Demo → 申请试用 / 登录

Public 不读取生产数据；所有工作区结果由 ONE Product Core 提供。

PUBLIC-02 • 产品与能力

非设计权威、不可直接实现。商业官网只承载产品叙事、可信 Demo 与转化入口。

序境 LUMENIS

产品 · 行业 · 案例 · 帮助 · 登录　申请试用

产品域地图

能力 → 适用场景 → Workspace。首屏说明真实适用范围与不可用条件。

按角色/问题筛选

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

真实 Demo 状态

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

Desktop-only 能力边界

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

能力 → 适用场景 → Workspace

Public 不读取生产数据；所有工作区结果由 ONE Product Core 提供。

PUBLIC-03 • 行业与使用场景

非设计权威、不可直接实现。商业官网只承载产品叙事、可信 Demo 与转化入口。

序境 LUMENIS

产品 · 行业 · 案例 · 帮助 · 登录　申请试用

行业选择器

问题 → 工作流 → 预期结果。首屏说明真实适用范围与不可用条件。

角色旅程

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

业务结果

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

数据/权限前置

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

问题 → 工作流 → 预期结果

Public 不读取生产数据；所有工作区结果由 ONE Product Core 提供。

PUBLIC-04 • 客户案例与 Demo

非设计权威、不可直接实现。商业官网只承载产品叙事、可信 Demo 与转化入口。



PUBLIC-05 • 试用 / 企业采购 / 联系

非设计权威、不可直接实现。商业官网只承载产品叙事、可信 Demo 与转化入口。

序境 LUMENIS

产品 · 行业 · 案例 · 帮助 · 登录　申请试用

试用路径

资格确认 → 申请 → 跟进。首屏说明真实适用范围与不可用条件。

部署/安全选项

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

采购资料包

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

联系人与 SLA

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

资格确认 → 申请 → 跟进

Public 不读取生产数据；所有工作区结果由 ONE Product Core 提供。

PUBLIC-06 • 帮助 / 登录 / 工作区入口

非设计权威、不可直接实现。商业官网只承载产品叙事、可信 Demo 与转化入口。

序境 LUMENIS

产品 · 行业 · 案例 · 帮助 · 登录　申请试用

帮助搜索

解决问题 → 进入正确表面。首屏说明真实适用范围与不可用条件。

产品状态

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

登录/工作区

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

桌面客户端下载

清晰定义、真实状态、可回到产品入口。

解决问题 → 进入正确表面

Public 不读取生产数据；所有工作区结果由 ONE Product Core 提供。

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

ACC-01 • 登录与可信入口

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER BLOCKED　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Enter credentials or select a supported sign-in method; show validation, pending, rejected and recovered states distinctly.

Responsive recomposition

Centered form with help/status pane → single-column form with touch-safe fields and explicit return.

Surface boundary

Web: 商业入口；pre-beta 不设产品账号墙 · Desktop: 企业身份与私有部署入口 · Mobile: 后 beta 登录/恢复；pre-beta 不阻断

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-025, LUNA-026, LUNA-027, LUNA-028, LUNA-219

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

ACC-02 • Subject / Lens 选择

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER BLOCKED　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Search/select an authorized Subject, then confirm an available lens; server response controls the destination.

Responsive recomposition

Searchable split list/detail → searchable full-screen list then focused subject confirmation.

Surface boundary

Web: 主入口（受产品账号时序约束） · Desktop: 完整身份/恢复能力 · Mobile: 查看、恢复、轻量确认

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-029, LUNA-030, LUNA-031, LUNA-032

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

ACC-03 • 工作区启动台

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER BLOCKED　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Resume a restorable work context or start a named product task.

Responsive recomposition

Persistent domain rail plus recent-work canvas → compact destinations and one prominent resume/start action.

Surface boundary

Web: 主入口（受产品账号时序约束） · Desktop: 完整身份/恢复能力 · Mobile: 查看、恢复、轻量确认

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-033, LUNA-034, LUNA-035, LUNA-036

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

ACC-04 • 访问恢复与防护

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER BLOCKED　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Retry, switch to authorized account/context, or request access through a real flow once verified.

Responsive recomposition

Diagnostic steps beside the attempted destination → sequential recovery cards with clear back path.

Surface boundary

Web: 主入口（受产品账号时序约束） · Desktop: 完整身份/恢复能力 · Mobile: 查看、恢复、轻量确认

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-037, LUNA-038, LUNA-039, LUNA-040

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 09

CTH-01 • 商业运营总览

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC YES　FLUTTER PARTIAL　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Scrub a change on the timeline, inspect its source, open/create a case or decision and trace the follow-up.

Responsive recomposition

Parallel metrics + timeline + action queue → one active signal with swipeable evidence and a contextual action sheet.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Implemented Flutter slice, but full action/runtime/device acceptance remains open. PDF tasks: SOL-041, LUNA-042, LUNA-043, LUNA-044

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 09

CTH-02 • 主体 / 商业单元档案

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC YES　FLUTTER PARTIAL　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Expand a relationship and inspect its provenance; switch the selected Subject only through the authorized context control.

Responsive recomposition

Hierarchical tree and relationship table → compact breadcrumb hierarchy with focused relationship cards.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Implemented Flutter slice, but full action/runtime/device acceptance remains open. PDF tasks: SOL-045, LUNA-046, LUNA-047, LUNA-048

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 10

CTH-03 • 实时监测

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Pause/resume viewing, pin an event, open source evidence; health actions remain permission-gated.

Responsive recomposition

Multi-source live board with filters → prioritized single stream and persistent freshness/connection badge.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-049, LUNA-050, LUNA-051, LUNA-052

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 10

CTH-04 • 事件关系图

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Select a node to reveal linked evidence, navigate to its case, then Trace/Return to the same graph position.

Responsive recomposition

Interactive graph + synchronized timeline → vertical event path with evidence nodes and saved zoom/focus.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-053, LUNA-054, LUNA-055, LUNA-056

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 10

CTH-05 • 舆情情绪日历

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Choose a day/range to inspect events and sources; switch to list view for precise keyboard access.

Responsive recomposition

Month heatmap beside date detail → week/day agenda with density marks and a slide-up evidence list.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-057, LUNA-058, LUNA-059, LUNA-060

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 10

CTH-06 • 负面监测与处置

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Verify original Source, classify or link to a Case, and preserve the source wording and lineage.

Responsive recomposition

Dense triage table with source inspector → stacked review cards with filters and full-screen source reader.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-061, LUNA-062, LUNA-063, LUNA-064

CTH-07 • 趋势分析

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Add/remove a compatible metric or cohort and inspect the contribution/evidence behind a delta.

Responsive recomposition

Resizable synchronized charts and formula table → one primary chart, horizontal metric switcher and tappable delta explanation.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-065, LUNA-066, LUNA-067, LUNA-068

CTH-08 • Case 与知识库

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Move a case through an authorized state transition; promote a reviewed conclusion to knowledge without overwriting facts.

Responsive recomposition

Board/list toggle with case timeline inspector → prioritized case inbox and step-by-step timeline.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-069, LUNA-070, LUNA-071, LUNA-072

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 11

CTH-09 • 风险与决策板

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Inspect basis, assign/record a decision, request approval and confirm the resulting action.

Responsive recomposition

Risk matrix plus decision ledger → ranked risk feed with focused decision detail and explicit confirmation.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-073, LUNA-074, LUNA-075, LUNA-076

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 11

CTH-10 • 报告与周报

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Select a period and verified blocks, inspect source list, preview and export with a recorded definition/window.

Responsive recomposition

Outline + live page preview + evidence rail → report sections list, one-page preview and share/export sheet.

Surface boundary

Web: 主要商业运营入口 · Desktop: 实时采集/深度分析/本地执行增强 · Mobile: 事件、结果、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-077, LUNA-078, LUNA-079, LUNA-080

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 09

BMP-01 • 品牌与市场总览

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC YES　FLUTTER PARTIAL　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Focus a brand, inspect a relationship's evidence and jump into its market, propagation or campaign path.

Responsive recomposition

Rich network canvas with linked channel and KPI strips → brand pulse summary with navigable relationship carousel and source trace.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Implemented Flutter slice, but full action/runtime/device acceptance remains open. PDF tasks: SOL-081, LUNA-082, LUNA-083, LUNA-084

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 12

BMP-02 • 品牌组合与竞品

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Compare or focus one brand; context switch is explicit and retains the previous focus for Return.

Responsive recomposition

Multi-brand canvas and comparison columns → searchable portfolio list with focused brand profile and competitor chips.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-085, LUNA-086, LUNA-087, LUNA-088

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 12

BMP-03 • 市场情报

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Filter a market/category window, inspect source provenance and mark a lead for review without calling it confirmed.

Responsive recomposition

Radar/landscape with evidence dossier → ranked opportunity feed and source-reader drill-in.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-089, LUNA-090, LUNA-091, LUNA-092

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 12

BMP-04 • 传播分析

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Trace a campaign/content item through the funnel and inspect each platform's source, metric definition and freshness.

Responsive recomposition

Flow visualization plus channel matrix → vertical funnel with channel selector and explicit metric/source details.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-093, LUNA-094, LUNA-095, LUNA-096

BMP-05 • 创作者生态

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Open a creator dossier, compare verified contributions, note collaboration risk or attach to an authorized campaign.

Responsive recomposition

Graph plus sortable roster and dossier → creator cards with fit/risk summary and dossier detail.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-097, LUNA-098, LUNA-099, LUNA-100

BMP-06 • 内容中心

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Upload/version content, review lineage and approval, then request an authorized publish handoff.

Responsive recomposition

Swimlane board with asset preview inspector → production queue with version stack and bottom approval actions.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-101, LUNA-102, LUNA-103, LUNA-104

BMP-07 • Campaign 工作区

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Build or revise a plan, assign owners/dates, request approval, record delivery and evaluate against its baseline.

Responsive recomposition

Timeline and channel allocation side-by-side → guided milestone sequence with compact objective and status header.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth


Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-105, LUNA-106, LUNA-107, LUNA-108

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 13

BMP-08 • Podcast Studio

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True

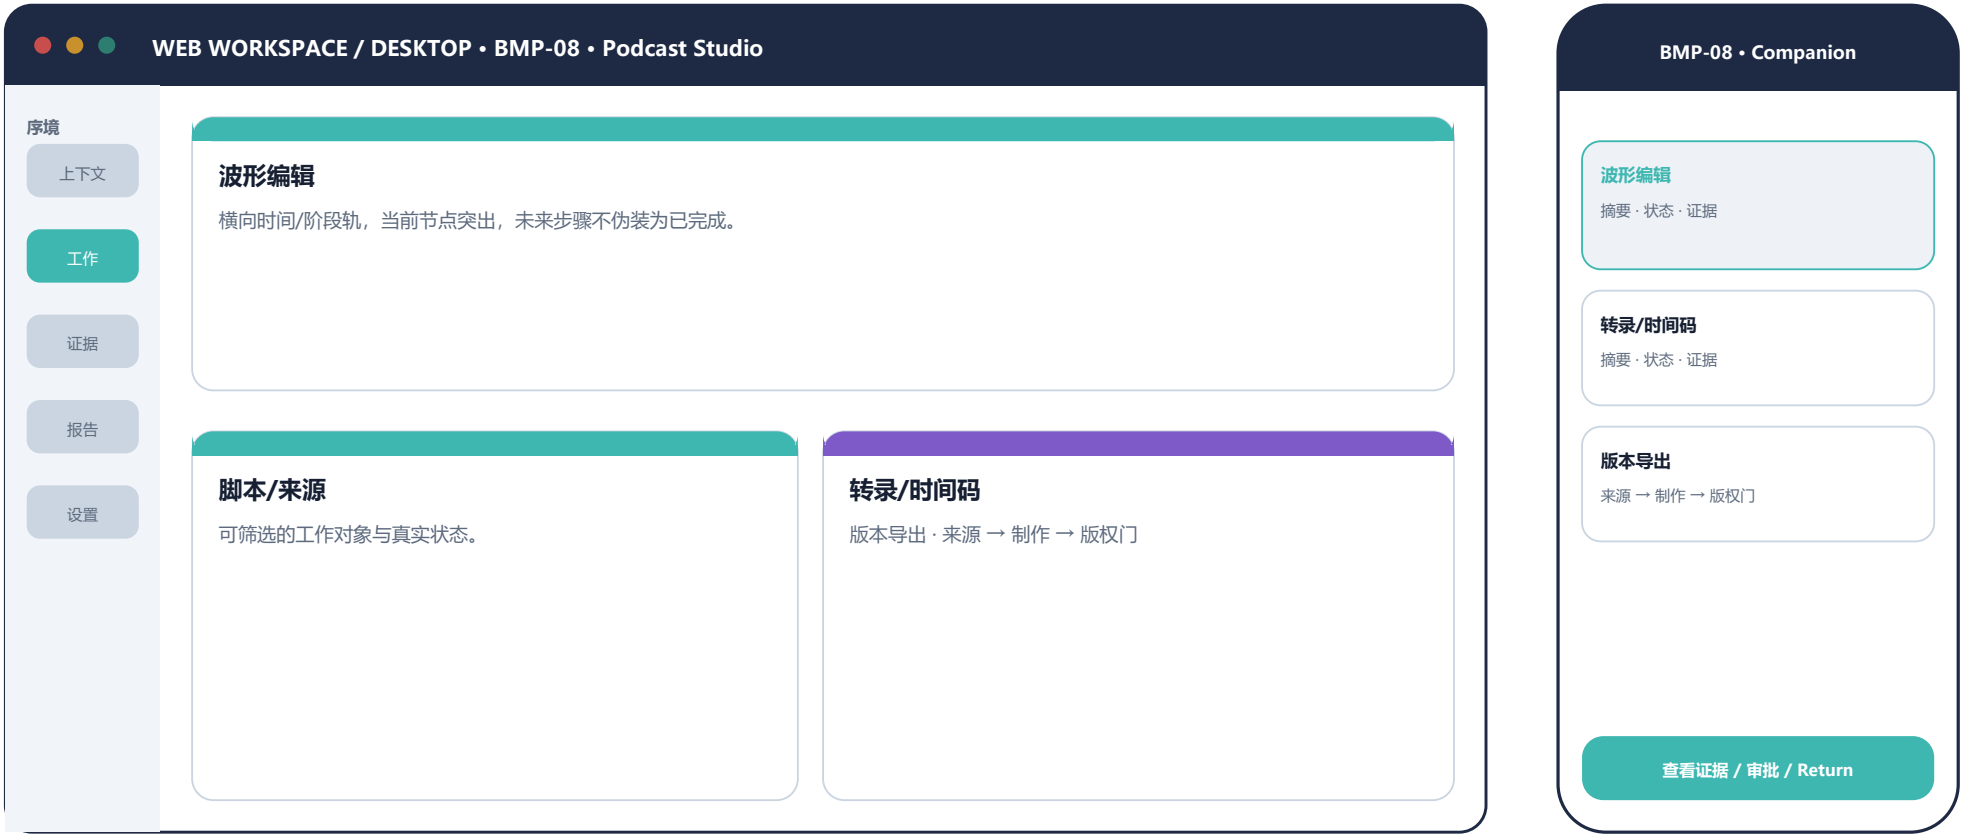

PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Draft from an approved brief/evidence set, edit transcript against audio, review source claims and export a versioned cut.

Responsive recomposition

Large waveform + script/source side panel → transcript-first editor with scrub controls and a source drawer.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-109, LUNA-110, LUNA-111, LUNA-112

BMP-09 • 品牌评价

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Select a brand/period, inspect a dimension's definition and evidence, then compare only aligned baselines.

Responsive recomposition

Score matrix with dimension trend small multiples → prioritized dimension list and one selected evidence-backed trend.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth


Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-113, LUNA-114, LUNA-115, LUNA-116

BMP-10 • 品牌风险与事件

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



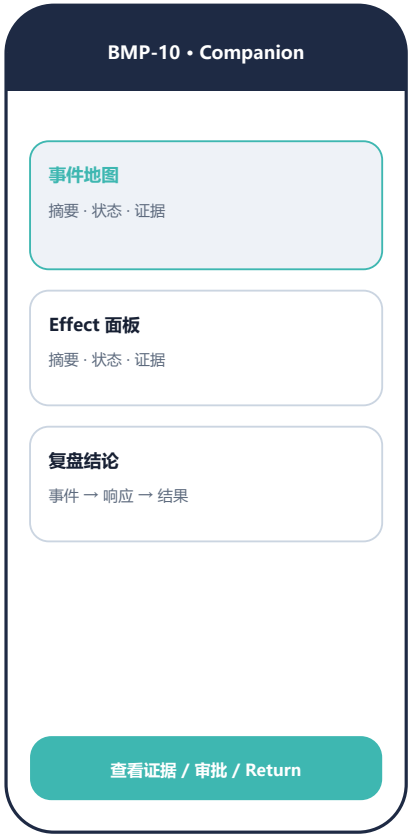

PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Triage an incident, assign a response, record approval/effect and revisit verified impact.

Responsive recomposition

Incident map plus response timeline → urgent queue with a focused incident detail and action ladder.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-117, LUNA-118, LUNA-119, LUNA-120

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 13

BMP-11 • Benchmark

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Select comparison set and time window, inspect normalization, identify a supported gap and export a traceable finding.

Responsive recomposition

Multi-column benchmark grid and small multiples → swipeable comparison cards with sticky metric definitions.

Surface boundary

Web: 主要品牌市场入口 · Desktop: 创作、文件、长任务、Local AI 增强 · Mobile: 结果、报告、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-121, LUNA-122, LUNA-123, LUNA-124

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 09

AI-01 • AI 意图入口

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC YES　FLUTTER PARTIAL　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

State a task, confirm authorized context, inspect evidence/capability plan and start only when an executable route exists.

Responsive recomposition

Composer and evidence preview in parallel → single prompt field with context chip and expandable plan preview.

Surface boundary

Web: 主要任务与结果入口 · Desktop: 本地 AI、长任务、文件/Browser 增强 · Mobile: 结果、通知、审批、快速追问

Acceptance truth

Implemented Flutter slice, but full action/runtime/device acceptance remains open. PDF tasks: SOL-125, LUNA-126, LUNA-127, LUNA-128

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

AI-02 • 能力任务工作台

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Start, pause/cancel, retry a safe stage or review a gated action before it runs.

Responsive recomposition

Stage graph with artifact inspector → vertical progress path with persistent cancel and expandable evidence.

Surface boundary

Web: 主要任务与结果入口 · Desktop: 本地 AI、长任务、文件/Browser 增强 · Mobile: 结果、通知、审批、快速追问

Acceptance truth


Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-129, LUNA-130, LUNA-131, LUNA-132

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

AI-03 • 证据锚定分析线程

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True

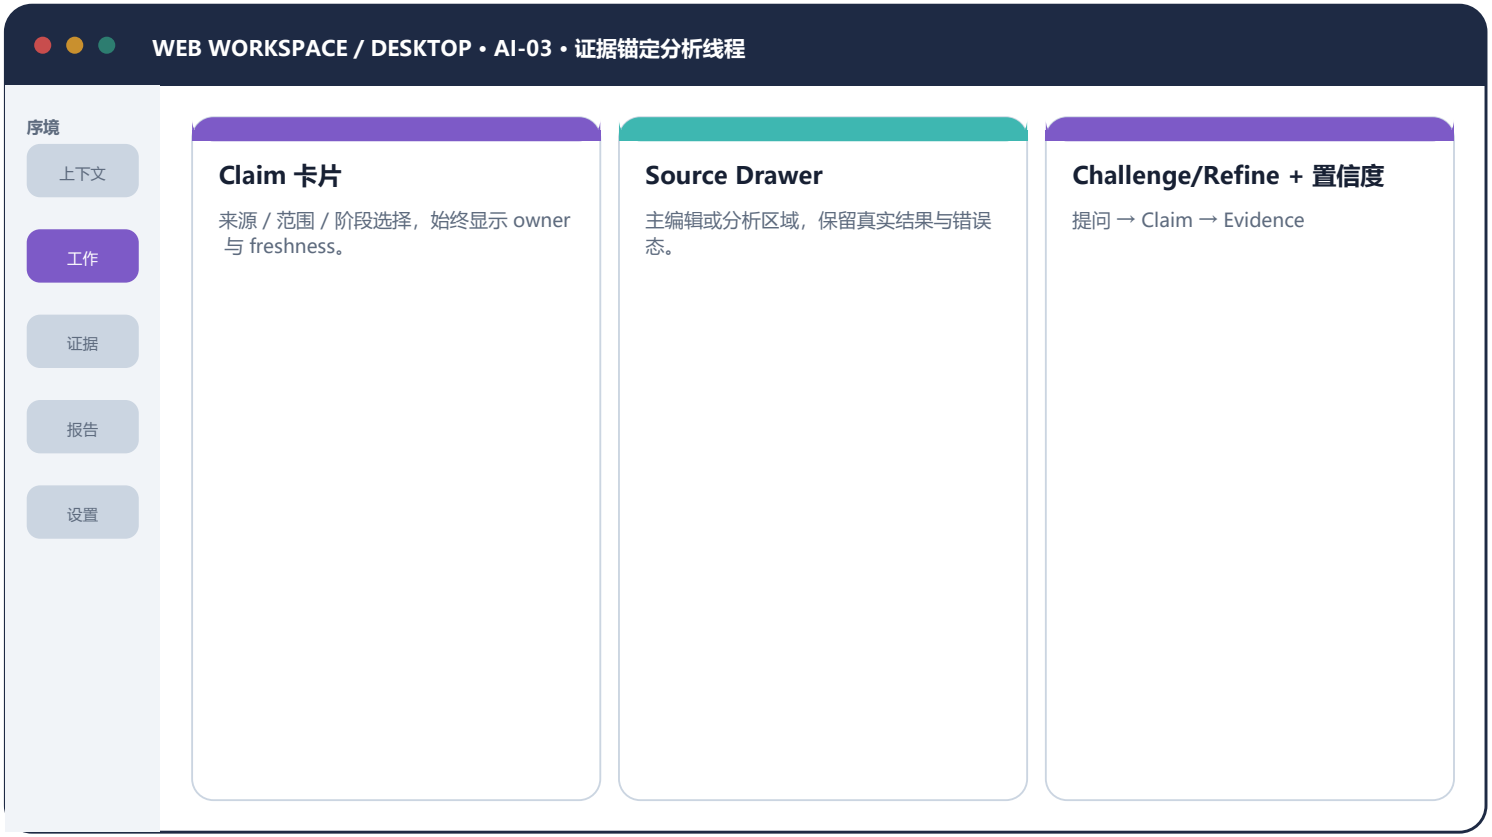



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Open a cited source at the relevant passage, challenge/refine a claim or create an owned follow-up task.

Responsive recomposition

Thread plus source inspector → claim cards with inline citations and full-screen source return.

Surface boundary

Web: 主要任务与结果入口 · Desktop: 本地 AI、长任务、文件/Browser 增强 · Mobile: 结果、通知、审批、快速追问

Acceptance truth


Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-133, LUNA-134, LUNA-135, LUNA-136

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

AI-04 • LUMENIS Product Skill Store

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True

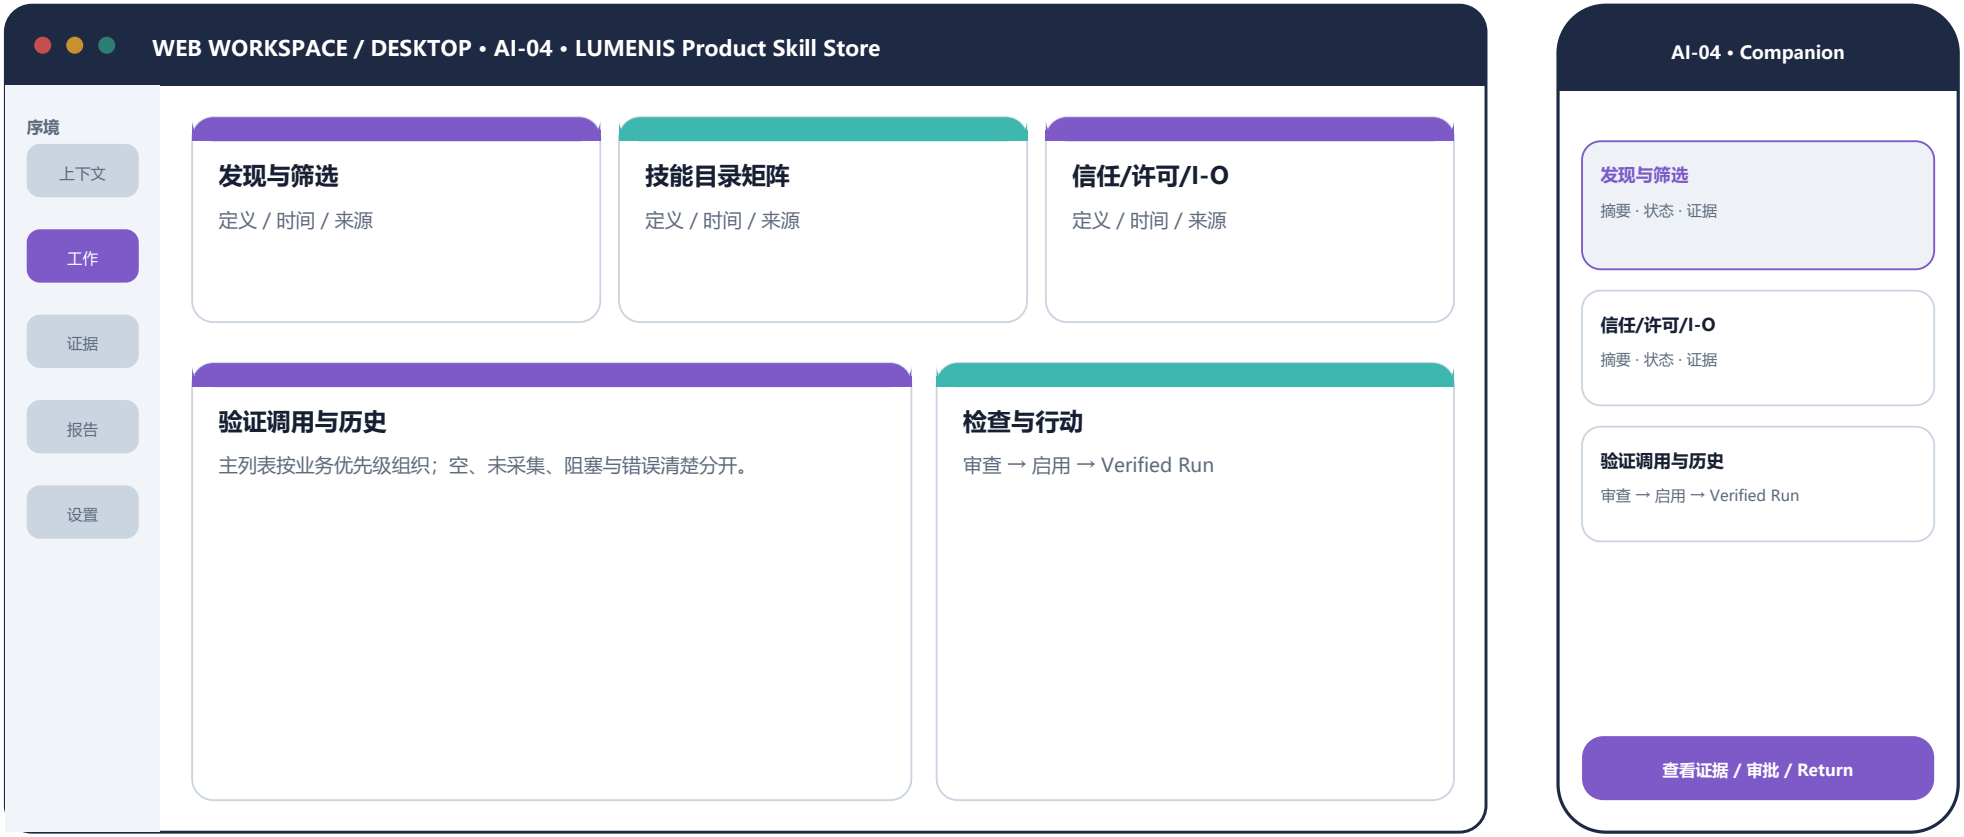

PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Filter by task, inspect input/output and permission contract, then run a safe verified capability.

Responsive recomposition

Matrix/catalog with capability detail panel → searchable capability list and detail sheet.

Surface boundary

Web: 主要任务与结果入口 · Desktop: 本地 AI、长任务、文件/Browser 增强 · Mobile: 结果、通知、审批、快速追问


Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-137, LUNA-138, LUNA-139, LUNA-140

AI-05 • AI Gateway 与 Providers

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True

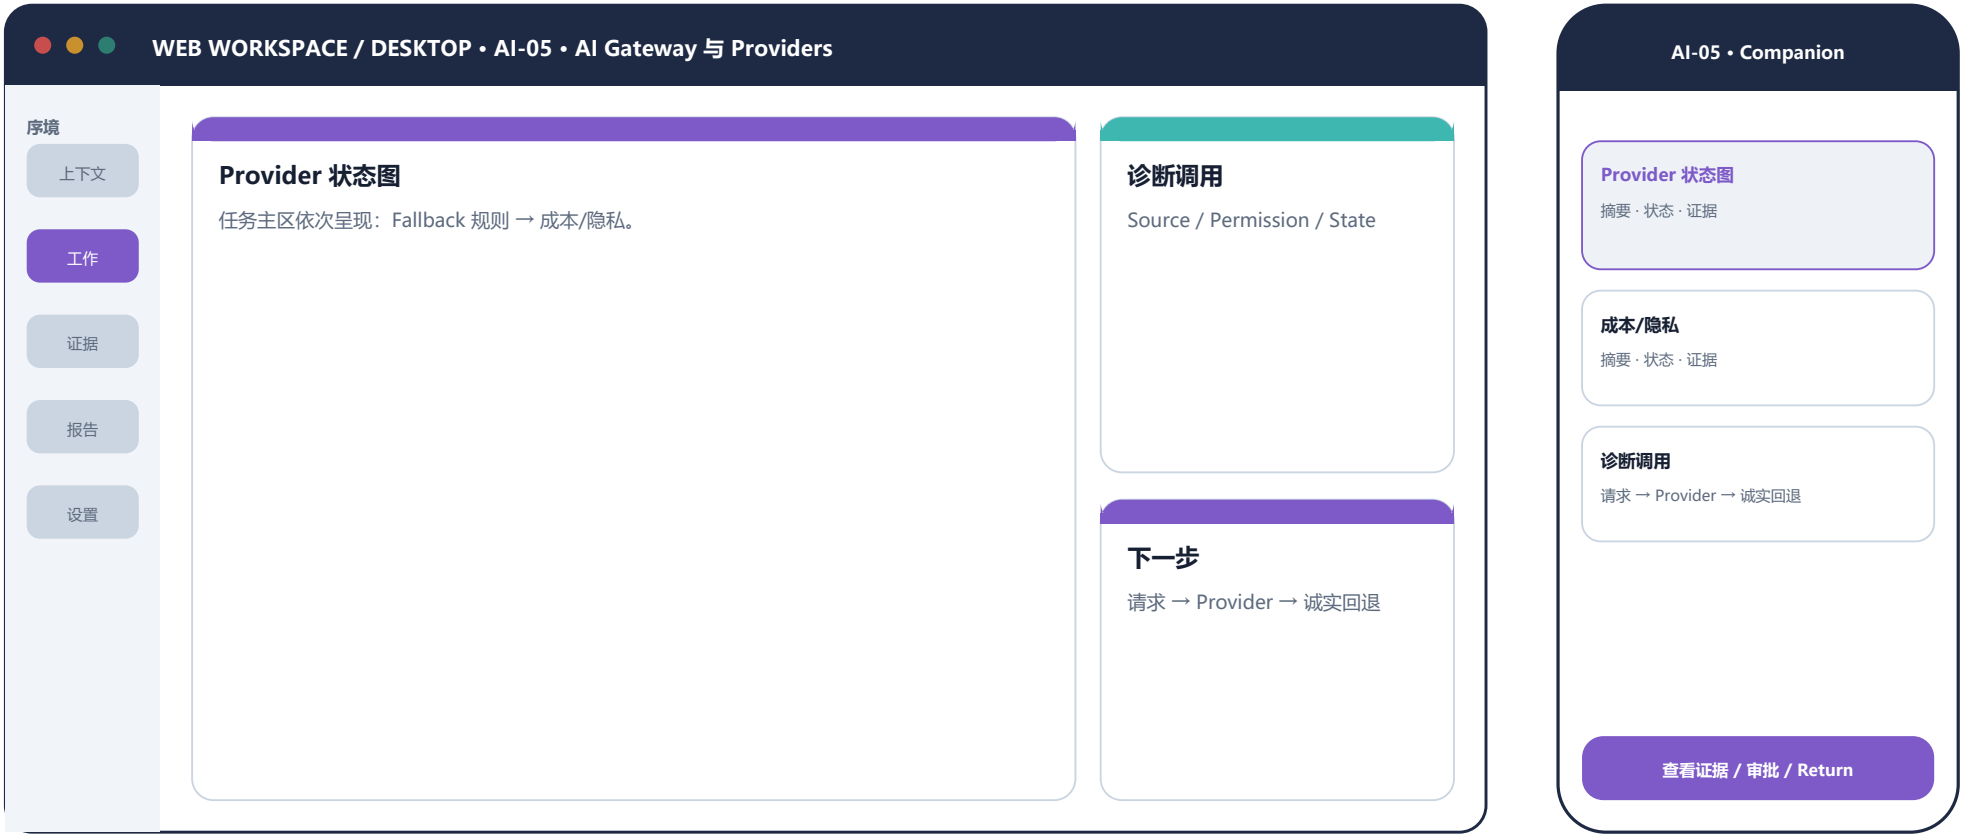

PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Inspect provider state or run a diagnostic; fallback must be observable and must not block core operations.

Responsive recomposition

Gateway flow map with health table → provider status list with explicit fallback/last-check details.

Surface boundary

Web: 主要任务与结果入口 · Desktop: 本地 AI、长任务、文件/Browser 增强 · Mobile: 结果、通知、审批、快速追问

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-141, LUNA-142, LUNA-143, LUNA-144

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 09

SYS-01 • Runtime Health

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC YES　FLUTTER PARTIAL　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Open a failing dependency's diagnostic, inspect trace and invoke only an authorized recovery.

Responsive recomposition

Dependency map with health timeline → ordered dependency list and focused diagnostic view.

Surface boundary

Web: 授权运营查看与轻量处置 · Desktop: 深度诊断、恢复与审计 · Mobile: 告警、诊断摘要、审批

Acceptance truth

Implemented Flutter slice, but full action/runtime/device acceptance remains open. PDF tasks: SOL-145, LUNA-146, LUNA-147, LUNA-148

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SYS-02 • Collector Status

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Inspect a run, retry/stop when allowed, and trace a collected record to its destination state.

Responsive recomposition

Live operations table with per-platform drilldown → platform queue cards with persistent running/retry status.

Surface boundary

Web: 远程状态、授权发起、结果查看 · Desktop: 主要/独占本地 Collector、CDP、Cookie、文件能力 · Mobile: 状态、通知、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-149, LUNA-150, LUNA-151, LUNA-152

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SYS-03 • Database Truth

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Inspect a table/chain validation and open exact integrity errors; recovery is a separately authorized path.

Responsive recomposition

Schema tree with chain timeline and diagnostics → chain stages with integrity summary and error detail.

Surface boundary

Web: 授权运营查看与轻量处置 · Desktop: 深度诊断、恢复与审计 · Mobile: 告警、诊断摘要、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-153, LUNA-154, LUNA-155, LUNA-156

SYS-04 • Security & Permission

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Simulate/read an access decision, inspect policy reason, or approve only through a real second-factor/approval contract.

Responsive recomposition

Matrix and audit ledger → searchable role/scope list with explicit decision detail.

Surface boundary

Web: 授权运营查看与轻量处置 · Desktop: 深度诊断、恢复与审计 · Mobile: 告警、诊断摘要、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-157, LUNA-158, LUNA-159, LUNA-160

SYS-05 • 设置与外观

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Change a local/account preference, preview, save and restore defaults; announce persisted scope.

Responsive recomposition

Side-by-side preference controls and live preview → grouped settings pages with immediate accessible preview.

Surface boundary

Web: 工作区偏好设置 · Desktop: 本地/企业设置增强 · Mobile: 个人偏好轻配置

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-161, LUNA-162, LUNA-163, LUNA-164

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SYS-06 • Internal Browser

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True



PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Navigate only within allowed capture rules, pin a snapshot as Evidence and inspect the audit result.

Responsive recomposition

Browser viewport plus evidence inspector → source capture full screen with a compact metadata/trace panel.

Surface boundary

Web: 远程状态、授权发起、结果查看 · Desktop: 主要/独占本地 Collector、CDP、Cookie、文件能力 · Mobile: 状态、通知、审批


Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-165, LUNA-166, LUNA-167, LUNA-168

SYS-07 • Evaluation & Acceptance

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True

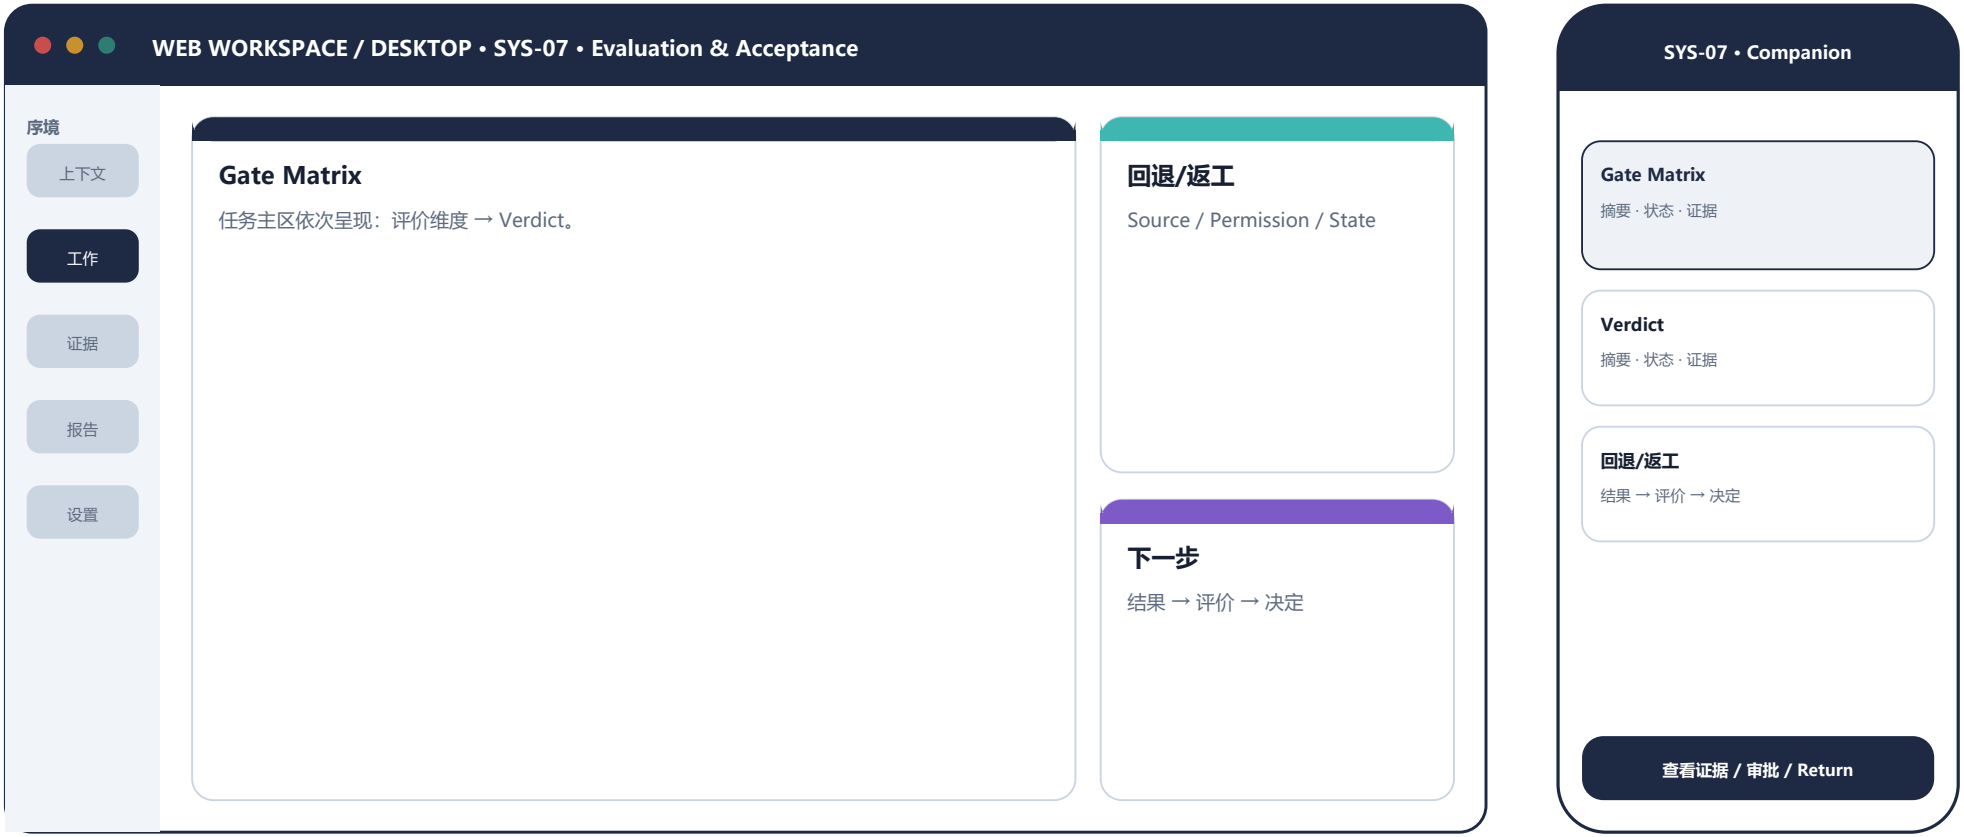

PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Open a gate's artifact, rerun a permitted check and inspect exact failing criterion.

Responsive recomposition

Gate matrix with evidence detail → sequential gate cards with current blocker and artifact links.

Surface boundary

Web: 授权运营查看与轻量处置 · Desktop: 深度诊断、恢复与审计 · Mobile: 告警、诊断摘要、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-169, LUNA-170, LUNA-171, LUNA-172

SYS-08 • Observability & Logs

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Filter by trace/time/component, inspect correlated logs and return to the originating runtime or task.

Responsive recomposition

Waterfall and query facets with detail pane → trace summary followed by scrollable spans and errors.

Surface boundary

Web: 授权运营查看与轻量处置 · Desktop: 深度诊断、恢复与审计 · Mobile: 告警、诊断摘要、审批

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-173, LUNA-174, LUNA-175, LUNA-176

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 09

SH-01 • 内容创作 Studio

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC YES　FLUTTER PARTIAL　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Create a draft from a real brief, cite evidence, review revisions and hand off for human approval.

Responsive recomposition

Three-zone canvas (sources/work/artifact) → focused editor with source drawer and version/action sheet.

Surface boundary

Web: 主要共享工作流入口 · Desktop: 文件、导出、长任务增强 · Mobile: 阅读、通知、审批、轻操作

Acceptance truth

Implemented Flutter slice, but full action/runtime/device acceptance remains open. PDF tasks: SOL-177, LUNA-178, LUNA-179, LUNA-180

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SH-02 • Evidence Library

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Search/filter, compare source with extracted item, inspect fresh ness and open its owning CTH/BMP origin.

Responsive recomposition

Dense result list with provenance inspector → searchable evide nce cards with full-screen source trace.

Surface boundary

Web: 主要共享工作流入口 · Desktop: 文件、导出、长任务增强 · M obile: 阅读、通知、审批、轻操作

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Ex perience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-181, LUNA-182, LUNA-183, LUNA-184

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SH-03 • Canonical Data Browser

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Inspect a field or metric and traverse lineage; this is read-only exploration, not business fact editing.

Responsive recomposition

Navigable schema tree plus query/result panes → table/metric list with definition and lineage drilldown.

Surface boundary

Web: 主要共享工作流入口 · Desktop: 文件、导出、长任务增强 · Mobile: 阅读、通知、审批、轻操作

Acceptance truth


Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-185, LUNA-186, LUNA-187, LUNA-188

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SH-04 • Report Export Center

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True

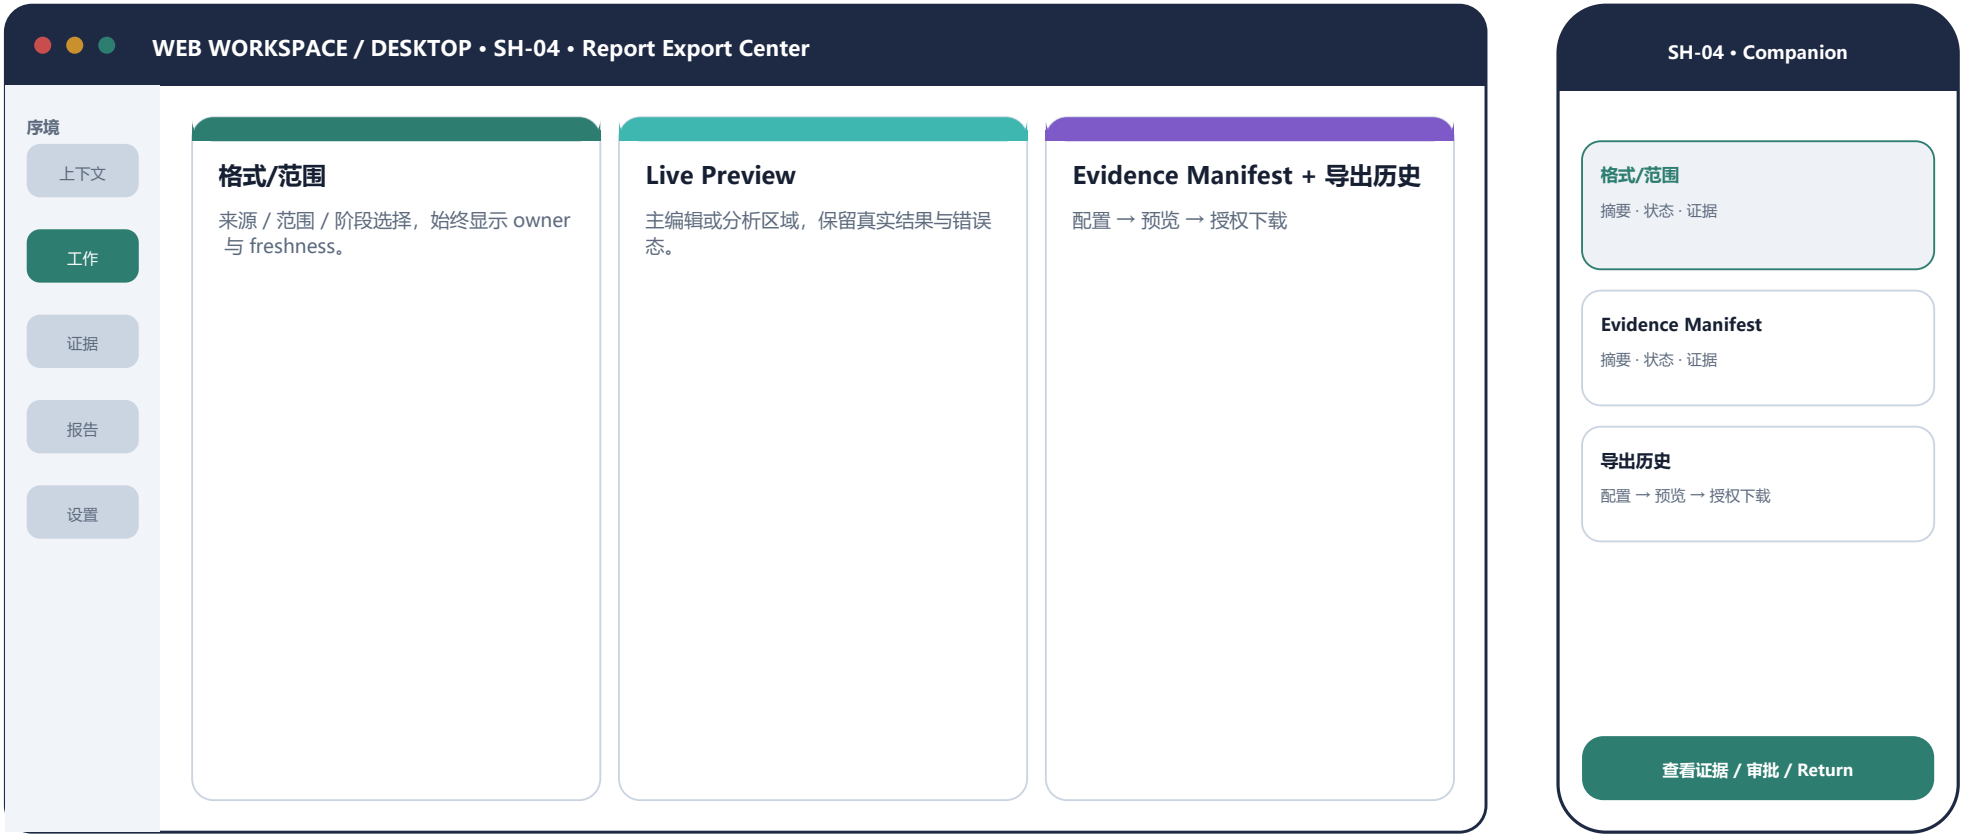

PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Choose PDF/Excel/PPT only when supported, set scope, inspect preview, export and retrieve audited artifact.

Responsive recomposition

Export configuration and artifact preview split → guided export steps and a final downloadable artifact view.

Surface boundary

Web: 主要共享工作流入口 · Desktop: 文件、导出、长任务增强 · Mobile: 阅读、通知、审批、轻操作

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-189, LUNA-190, LUNA-191, LUNA-192

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SH-05 • Learning Assets

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Open a learning asset, inspect verification history, propose a revision or use it as a cited task input.

Responsive recomposition

Asset shelves with review timeline → filtered learning library and one-asset reading view.

Surface boundary

Web: 主要共享工作流入口 · Desktop: 文件、导出、长任务增强 · Mobile: 阅读、通知、审批、轻操作

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-193, LUNA-194, LUNA-195, LUNA-196

DESIGN_EXPLORATION • ROUND 14

SH-06 • 通知与任务

非设计权威、不可直接实现。须经 Experience Constitution + 详细 Screen Spec + Sol DESIGN_READY 后才可编码。

SPEC NO　FLUTTER ABSENT　RUNTIME HTTP 200 / bound=True





PRODUCT CONTRACT

Primary interaction

Triage, assign/snooze/resolve only through authorized actions; every item returns to its originating task/evidence.

Responsive recomposition

Multi-lane inbox with detail inspector → prioritized queue and full-screen task action with clear origin/return.

Surface boundary

Web: 主要共享工作流入口 · Desktop: 文件、导出、长任务增强 · Mobile: 阅读、通知、审批、轻操作

Acceptance truth

Backend builder/contract may exist, but no canonical Flutter Experience slice or detailed spec. PDF tasks: SOL-197, LUNA-198, LUNA-199, LUNA-200

Screen 实现与表面状态 · 01–11

runtime bound=true 不提升 UI 或业务状态。

Screen	Spec	Binding	Flutter	Web	Desktop	Mobile	R	PDF tasks
ACC-01	NO	PARTIAL:1	BLOCKED	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-025, LUNA-026, LUNA-027, LUNA-028, LUNA-219
ACC-02	NO	PARTIAL:1	BLOCKED	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-029, LUNA-030, LUNA-031, LUNA-032
ACC-03	NO	PARTIAL:1	BLOCKED	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-033, LUNA-034, LUNA-035, LUNA-036
ACC-04	NO	PARTIAL:1	BLOCKED	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-037, LUNA-038, LUNA-039, LUNA-040
CTH-01	YES	PARTIAL:3	PARTIAL	ABSENT	PARTIAL	PARTIAL	R09	SOL-041, LUNA-042, LUNA-043, LUNA-044
CTH-02	YES	PARTIAL:1	PARTIAL	ABSENT	PARTIAL	PARTIAL	R09	SOL-045, LUNA-046, LUNA-047, LUNA-048
CTH-03	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R10	SOL-049, LUNA-050, LUNA-051, LUNA-052
CTH-04	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R10	SOL-053, LUNA-054, LUNA-055, LUNA-056
CTH-05	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R10	SOL-057, LUNA-058, LUNA-059, LUNA-060
CTH-06	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R10	SOL-061, LUNA-062, LUNA-063, LUNA-064
CTH-07	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R10	SOL-065, LUNA-066, LUNA-067, LUNA-068

Screen 实现与表面状态 · 12–22

runtime bound=true 不提升 UI 或业务状态。

Screen	Spec	Binding	Flutter	Web	Desktop	Mobile	R	PDF tasks
CTH-08	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R11	SOL-069, LUNA-070, LUNA-071, LUNA-072
CTH-09	NO	ABSENT:1; PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R11	SOL-073, LUNA-074, LUNA-075, LUNA-076
CTH-10	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R11	SOL-077, LUNA-078, LUNA-079, LUNA-080
BMP-01	YES	PARTIAL:1	PARTIAL	ABSENT	PARTIAL	PARTIAL	R09	SOL-081, LUNA-082, LUNA-083, LUNA-084
BMP-02	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R12	SOL-085, LUNA-086, LUNA-087, LUNA-088
BMP-03	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R12	SOL-089, LUNA-090, LUNA-091, LUNA-092
BMP-04	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R12	SOL-093, LUNA-094, LUNA-095, LUNA-096
BMP-05	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R12	SOL-097, LUNA-098, LUNA-099, LUNA-100
BMP-06	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R13	SOL-101, LUNA-102, LUNA-103, LUNA-104
BMP-07	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R13	SOL-105, LUNA-106, LUNA-107, LUNA-108
BMP-08	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R13	SOL-109, LUNA-110, LUNA-111, LUNA-112

Screen 实现与表面状态 · 23–33

runtime bound=true 不提升 UI 或业务状态。

Screen	Spec	Binding	Flutter	Web	Desktop	Mobile	R	PDF tasks
BMP-09	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R13	SOL-113, LUNA-114, LUNA-115, LUNA-116
BMP-10	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R13	SOL-117, LUNA-118, LUNA-119, LUNA-120
BMP-11	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R13	SOL-121, LUNA-122, LUNA-123, LUNA-124
AI-01	YES	PARTIAL:2	PARTIAL	ABSENT	PARTIAL	PARTIAL	R09	SOL-125, LUNA-126, LUNA-127, LUNA-128
AI-02	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-129, LUNA-130, LUNA-131, LUNA-132
AI-03	NO	ABSENT:1; EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-133, LUNA-134, LUNA-135, LUNA-136
AI-04	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-137, LUNA-138, LUNA-139, LUNA-140
AI-05	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-141, LUNA-142, LUNA-143, LUNA-144
SYS-01	YES	PARTIAL:1	PARTIAL	ABSENT	PARTIAL	PARTIAL	R09	SOL-145, LUNA-146, LUNA-147, LUNA-148
SYS-02	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-149, LUNA-150, LUNA-151, LUNA-152
SYS-03	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-153, LUNA-154, LUNA-155, LUNA-156

Screen 实现与表面状态 · 34–44

runtime bound=true 不提升 UI 或业务状态。

Screen	Spec	Binding	Flutter	Web	Desktop	Mobile	R	PDF tasks
SYS-04	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-157, LUNA-158, LUNA-159, LUNA-160
SYS-05	NO	LOCAL_ONLY:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-161, LUNA-162, LUNA-163, LUNA-164
SYS-06	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-165, LUNA-166, LUNA-167, LUNA-168
SYS-07	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-169, LUNA-170, LUNA-171, LUNA-172
SYS-08	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-173, LUNA-174, LUNA-175, LUNA-176
SH-01	YES	ABSENT:3; PARTIAL:3	PARTIAL	ABSENT	PARTIAL	PARTIAL	R09	SOL-177, LUNA-178, LUNA-179, LUNA-180
SH-02	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-181, LUNA-182, LUNA-183, LUNA-184
SH-03	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-185, LUNA-186, LUNA-187, LUNA-188
SH-04	NO	PARTIAL:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-189, LUNA-190, LUNA-191, LUNA-192
SH-05	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-193, LUNA-194, LUNA-195, LUNA-196
SH-06	NO	EXISTS_BUT_UNSCOPED:1	ABSENT	ABSENT	ABSENT	ABSENT	R14	SOL-197, LUNA-198, LUNA-199, LUNA-200

ORIGINAL TASKBOOK • FULL COVERAGE

PDF Task 映射 • 001–009 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
11	SOL-000	SOL	接管规则 + 审计基线冻结	R01	PARTIAL	把这份任务书作为 Sol 产品经理窗口的唯一执行索引；每次任务前重新 resolve origin/main，不把 PDF 中的 SHA 当未来代码真相。	Sol 能对每个后续 Task 给出：GO / BLOCKED / SPLIT / REORDER，并要求 Luna 返回 commit + tests + blockers。
12	SOL-001	SOL	确定 Internal Beta MVP 闭环	R01	PARTIAL	从现有产品真实能力中确定第一版内测最小闭环，必须能从真实 Source/Evidence 走到用户结果与 Return，而不是“一个页面能打开”。	输出 3-5 条 beta critical journeys，并给每条明确 entry → action → result → evidence → return/evaluation。
13	SOL-002	SOL	建立 Batch 依赖图与上下文重置规则	R01	PARTIAL	把全部任务按 Truth owner 和依赖关系排成可并行/不可并行 Batch；明确何时 Luna 继续同一窗口，何时必须新窗口。	每个 Batch 有入口 SHA、允许路径、禁止路径、验收点、退出条件；上下文超过一个 owner family 或出现漂移时新开 Luna chat。
14	LUNA-003	LUNA	现场 Git / Branch / 工作树校验	R01	PARTIAL	在本地执行机确认 main 与 origin/main 一致、无隐藏 side branch、保存未知未提交工作，并记录真实起始 SHA。	返回 current HEAD、origin/main、remote heads、git status、是否 clean；任何差异精确列出。
15	LUNA-004	LUNA	191 个根级 Python Caller 分类清单	R02	PARTIAL	逐个分类根目录 191 个 Python 文件为 canonical owner / active compatibility caller / migrate-ready / provenance-only / delete-ready，禁止凭文件名删。	每个根文件有 owner、unique behavior、direct caller、tests、迁移条件；没有证据则 keep/unknown。
16	SOL-005	SOL	审核 Root Caller 收敛矩阵	R02	PARTIAL	审核 LUNA-004，决定每组 caller 的 keep / adapt / absorb / retire 次序；把 destructive cleanup 推迟到唯一行为完成迁移后。	每组兼容层得到明确决策与后续 Luna task；UNKNOWN 不进入删除。
17	LUNA-006	LUNA	Shared Database Authority 最终收敛	R03	TESTED	证明所有生产 DB 访问经过 lumenis/shared/database；兼容 database.py/db_paths.py/migrations wrappers 只保留必要 API，不再形成第二 owner。	tracked production source 直接 sqlite3.connect=0；path/migration/repository authority 唯一；wrapper 行为回归绿。
18	LUNA-007	LUNA	Pre-beta 无产品账号墙 + Dual Auth 边界	R04	PARTIAL	让 App 在 internal beta 前不被 LUMENIS 产品账号墙阻塞，同时保留 Core Basic/account session 与服务端 Permission；媒体 Cookie 身份完全分离。	App 可进入 pre-beta shell；受保护操作仍真实 401/403/Permission；双通道状态文案准确。
19	LUNA-008	LUNA	CTH Subject Context + per-Subject Read Permission	R04	PARTIAL	把 authenticated actor、CTH Subject context、逐 Subject 业务 read Permission 串成可信服务端决策，供所有 CTH screens 复用。	服务端能返回/执行 actor→Subject read decision；denied/unknown fail closed；所有 CTH screen 可复用同一 contract。

PDF Task 映射 • 010–018 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
20	LUNA-009	LUNA	BMP BrandFocus Context + Authorization	R04	PARTIAL	建立/收敛现有 BMP BrandFocus 的可信 actor scope 与 read authorization，替代产品级 ZBMP 聚合充当选中品牌。	BrandFocus 由可信服务端 context 决定；授权/未授权/无 focus 分状态；BMP 查询能按 focus scope。
21	LUNA-010	LUNA	Shared Evidence Actor/Domain/Object Scope	R04	PARTIAL	给 Shared Evidence 读路径补 actor + product/domain + object/origin scope，并保留 source identity/freshness/lineage。	可按 CTH Subject/BMP BrandFocus/AI execution/origin 查询；无 scope fail closed；原始 Evidence 不被 AI/human output 覆盖。
22	LUNA-011	LUNA	Reporting / Export Permission + Lineage	R04	PARTIAL	让 report/export 从同一 canonical truth + Evidence lineage 生成，并通过 Permission/approval/effect fence；失败不可假成功。	报告 preview/export 同源；scope/period/methodology/Evidence 可追；export audit 完整。
23	LUNA-012	LUNA	AI Gateway 单一 Runtime Owner	R07	PARTIAL	确认所有产品 AI caller 收敛到 lumenis/system/ai_gateway，local_ai_client.py 只保留兼容 adapter 或吸收后 retire；Ollama provider live state 真实可见。	单一 provider/fallback status contract；真实 probe 区分 configured/ready/degraded/offline；兼容 caller 有清晰去向。
24	LUNA-013	LUNA	AI Task / Execution Route 单一化	R07	PARTIAL	收敛 ai_api.py / ai_task_engine / shared agents skills 的 task/execution route，消除重复声明/平行执行语义。	一个 canonical execution path；create/run/cancel/evidence/approval 语义一致；重复 route 消失或明确 compatibility。
25	LUNA-014	LUNA	SYSTEM Collector 单一 Runtime 收敛	R06	PARTIAL	把 root collector/automation callers 绑定到 lumenis/system/collector；各平台 adapter 统一 Source→Evidence→Canonical，保留 Cookie/session 策略。	collector registry/runtime/scheduler/guard 的 owner 唯一；root caller 仅 compatibility；关键平台回归绿。
26	LUNA-015	LUNA	Browser/CDP + Media Cookie Session 收敛	R06	PARTIAL	统一 Browser Surface / browser runtime / XHS Cookie bridge 调用边界，保持 9223 HK collector 与 9224 general browser 的真实用途和 provenance。	浏览/采集 session purpose 可辨；policy/allowed target/provenance 生效；无 secret 泄漏。
27	LUNA-016	LUNA	RuntimeGuardian / Recovery Owner 收敛	R05	PARTIAL	RuntimeGuardian、supervisor、recovery 仅表达 SYSTEM runtime truth；DB access 走 repository，状态不与业务健康混淆。	健康、degraded、offline、unknown、recovery 明确；单 supervisor 逻辑可重复启动。
28	LUNA-017	LUNA	启动链与本地 Production Preflight	R05	PARTIAL	验证 canonical Windows launcher 从依赖→supervisor→8201 health→9223/9224 browser 初始化到关键 API，失败能定位。	重复启动幂等；8201 唯一 supervisor；healthz 与关键 API 可用；browser health 分开报告。

PDF Task 映射 • 019–027 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
29	LUNA-018	LUNA	Product Gate / App Gate 可重复绿化	R15	PARTIAL	让当前 main 在手动/PR Gate 上真实执行并绿；红色不得靠 continue-on-error、跳测试或改成 advisory 消失。	Tier A/B clean checkout green；App analyze/test green；latest run 对 current SHA 有证据。
30	LUNA-019	LUNA	Legacy 名称 / 兼容标识逐项清理	R02	PARTIAL	清理用户可见与无必要的历史命名；对兼容 ID/mutex/env 逐项分类，不做全仓字符串替换。	用户可见只剩 序境/LUMENIS/BMP/CTH；保留兼容标识有注释/owner/迁移理由；3 个显著 legacy path 有处置。
31	SOL-020	SOL	Experience 共用 Primitive 边界审核	R08	PARTIAL	决定哪些行为可成为共享 primitive（typography/input/evidence/state/focus/motion），哪些必须留在 screen composition，防止 Luna 做 universal renderer。	输出共享 primitive whitelist + screen-specific composition red lines。
32	LUNA-021	LUNA	Flutter Shell Context-aware 重构	R08	PARTIAL	把现有五目的地工程壳重构成 context-aware workspace：Subject/Brand/Task/Runtime 状态清晰，但不把 44 个 route 平铺成导航。	360/390/430/768/1024/1280/1440/1920 无 overflow；navigation/restoration/context 可测试。
33	LUNA-022	LUNA	State / Evidence / Focus 共享 Primitive	R08	PARTIAL	实现可复用但不决定页面布局的 State、Evidence anchor、Trace/Return、focus、loading/error/offline 等语义 primitives。	各 screen 可组合使用；无视觉骨架绑定；键盘/语义/屏读可测试。
34	LUNA-023	LUNA	三语 Copy Key / 长文本 / Locale 基础	R08	PARTIAL	把 machine ID→semantic key→ZH/EN/KO display 的基础接到 Flutter；真实 business data 不进 locale copy。	关键 shell/state/action copy 可三语；long text 不溢出；fallback 明确。
35	SOL-024	SOL	Golden Pages 开工顺序与验收门	R09	PARTIAL	确认五 Golden Pages + CTH-02 的实现顺序，要求先关闭对应 backend scope，再做 UI，再做 acceptance。	每个 Golden Page 有独立 GO 条件；后续 remaining screens 才能按 workflow family 展开。
36	SOL-025	SOL	ACC-01 | 认证入口：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 ACC-01 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：安静的身份入口；仅展示真实支持的认证方式，内测前不得形成全局产品账号墙。；主操作：凭据/已支持登录 → 校验/拒绝/恢复；业务读取仍需后续 Permission。；移动：单列表单，显式返回与错误恢复。；所 有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
37	LUNA-026	LUNA	ACC-01 | 认证入口：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 ACC-01 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	保留 Core Basic 与 v4 account 两条现有身份通道；先验证真实行为，再绑定逐屏权限。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。

PDF Task 映射 • 028–036 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
38	LUNA-027	LUNA	ACC-01 | 认证入口：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 ACC-01 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：安静的身份入口；仅展示真实支持的认证方式，内测前不得形成全局产品账号墙。；主交互完成：凭 据/已支持登录 → 校验/拒绝/恢复；业务读取仍需后续 Permission。；mobile 重组：单列表单，显式返回与错误恢复。； 状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
39	LUNA-028	LUNA	ACC-01 | 认证入口：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 ACC-01 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以 “页面能渲染” 作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
40	SOL-029	SOL	ACC-02 | 主体与 Lens 选择：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 ACC-02 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：先选择授权 Subject，再选择 CTH/BMP Lens；Subject 身份与观察 Lens 分离。；主操作：搜索/选 Subject → 选择可用 Lens → 服务端决定目的地。；移动：全屏主体列表 → 主体确认 → Lens。；所有字段/ 动作有 source 或明确 BLOCKED。
41	LUNA-030	LUNA	ACC-02 | 主体与 Lens 选择：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 ACC-02 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	保留 selection-only registry；活动 Subject 切换必须走既有 context + per-Subject Permission。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
42	LUNA-031	LUNA	ACC-02 | 主体与 Lens 选择：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 ACC-02 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：先选择授权 Subject，再选择 CTH/BMP Lens；Subject 身份与观察 Lens 分离。；主交互完成：搜索 /选 Subject → 选择可用 Lens → 服务端决定目的地。；mobile 重组：全屏主体列表 → 主体确认 → Lens。；状态/Trac e/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
43	LUNA-032	LUNA	ACC-02 | 主体与 Lens 选择：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 ACC-02 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以 “页面能渲染” 作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
44	SOL-033	SOL	ACC-03 | 工作区启动：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 ACC-03 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：最近工作、CTH/BMP 入口、AI 单一意图入口组成启动空间；健康状态只是小指示。；主操作：恢复可恢复上下文或开始一个明确任务。；移动：紧凑目的地 + 一个主要 Resume/Start。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
45	LUNA-034	LUNA	ACC-03 | 工作区启动：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 ACC-03 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	将 runtime health 读绑定可信 SYSTEM actor；不得把健康状态做成业务 Dashboard。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
46	LUNA-035	LUNA	ACC-03 | 工作区启动：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 ACC-03 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：最近工作、CTH/BMP 入口、AI 单一意图入口组成启动空间；健康状态只是小指示。；主交互完成：恢 复可恢复上下文或开始一个明确任务。；mobile 重组：紧凑目的地 + 一个主要 Resume/Start。；状态/Trace/Return/keybo ard/touch/semantics 完整。

PDF Task 映射 • 037–045 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
47	LUNA-036	LUNA	ACC-03 | 工作区启动：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 ACC-03 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
48	SOL-037	SOL	ACC-04 | 访问恢复与守卫：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 ACC-04 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：解释具体阻塞步骤、缺失 scope 与真实恢复路径，不伪造角色或权限。；主操作：重试 / 切换已授权上下文 / 真实 request-access（若存在）。；移动：顺序恢复步骤 + 清晰返回。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
49	LUNA-038	LUNA	ACC-04 | 访问恢复与守卫：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 ACC-04 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 auth_recovery_center；连接可信 actor、记录 scope，并验证恢复动作边界。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
50	LUNA-039	LUNA	ACC-04 | 访问恢复与守卫：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 ACC-04 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：解释具体阻塞步骤、缺失 scope 与真实恢复路径，不伪造角色或权限。；主交互完成：重试 / 切换 已授权上下文 / 真实 request-access（若存在）。；mobile 重组：顺序恢复步骤 + 清晰返回。；状态/Trace/Return/keyb oard/touch/semantics 完整。
51	LUNA-040	LUNA	ACC-04 | 访问恢复与守卫：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 ACC-04 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
52	SOL-041	SOL	CTH-01 | 商业运营总览：Screen Spec 闭合	R09	PARTIAL	把 CTH-01 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Subject 锚定运营台：指标脊柱、时间信号、Event/Evidence 焦点、Decision/Action 入口。；主操作：选择时间变化 → 看来源 → 进入 Case/Decision → Trace/Return。；移动：一个活动信号 + Evidence 抽 屉 + 上下文 Action。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
53	LUNA-042	LUNA	CTH-01 | 商业运营总览：Backend / Binding 闭合	R09	PARTIAL	仅关闭 CTH-01 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	给 KPI/Event/Insight 绑定可信 Subject、freshness 与 Evidence；外部客流/销售缺失保持 NOT_COLLECTED。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
54	LUNA-043	LUNA	CTH-01 | 商业运营总览：App UI / UX 实现	R09	PARTIAL	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-01 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Subject 锚定运营台：指标脊柱、时间信号、Event/Evidence 焦点、Decision/Action 入口。；主交 互完成：选择时间变化 → 看来源 → 进入 Case/Decision → Trace/Return。；mobile 重组：一个活动信号 + Evidence 抽屉 + 上下文 Action。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
55	LUNA-044	LUNA	CTH-01 | 商业运营总览：Acceptance / E2E 证据	R09	PARTIAL	独立验证 CTH-01 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。

PDF Task 映射 • 046–054 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
56	SOL-045	SOL	CTH-02 | 经营主体与关联信息：Screen Spec 闭合	R09	PARTIAL	把 CTH-02 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Subject → 业务单元 → 品牌/业态的关系层级；目录选择与业务授权分离。；主操作：展开关系看 provenance；切换 Subject 只能走授权 context control。；移动：面包屑层级 + 单关系焦点。；所有字段/动 作有 source 或明确 BLOCKED。
57	LUNA-046	LUNA	CTH-02 | 经营主体与关联信息：Backend / Binding 闭合	R09	PARTIAL	仅关闭 CTH-02 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前仅 selection-only directory 可用；完整 profile/关系必须找到 canonical owner + Evidence 后再开放。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/ E2E。
58	LUNA-047	LUNA	CTH-02 | 经营主体与关联信息：App UI / UX 实现	R09	PARTIAL	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-02 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Subject → 业务单元 → 品牌/业态的关系层级；目录选择与业务授权分离。；主交互完成：展开关 系看 provenance；切换 Subject 只能走授权 context control。；mobile 重组：面包屑层级 + 单关系焦点。；状态/Trace /Return/keyboard/touch/semantics 完整。
59	LUNA-048	LUNA	CTH-02 | 经营主体与关联信息：Acceptance / E2E 证据	R09	PARTIAL	独立验证 CTH-02 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
60	SOL-049	SOL	CTH-03 | 实时监测：Screen Spec 闭合	R10	ABSENT	把 CTH-03 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：以 freshness 时钟、实时/已确认区分、source lanes 与 collector health 构成实时节奏。；主操作：暂停/恢复视图，pin Event，打开 source Evidence。；移动：优先级单流 + 持久 freshness/connection。 ；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
61	LUNA-050	LUNA	CTH-03 | 实时监测：Backend / Binding 闭合	R10	PARTIAL	仅关闭 CTH-03 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 verified notes/negative source；补 Subject scope、filter semantics、Evidence link。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
62	LUNA-051	LUNA	CTH-03 | 实时监测：App UI / UX 实现	R10	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-03 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：以 freshness 时钟、实时/已确认区分、source lanes 与 collector health 构成实时节奏。；主交 互完成：暂停/恢复视图，pin Event，打开 source Evidence。；mobile 重组：优先级单流 + 持久 freshness/connection 。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
63	LUNA-052	LUNA	CTH-03 | 实时监测：Acceptance / E2E 证据	R10	ABSENT	独立验证 CTH-03 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
64	SOL-053	SOL	CTH-04 | 事件关系：Screen Spec 闭合	R10	ABSENT	把 CTH-04 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：事件因果星图 + 时间轴；节点表达 Event/Case/Evidence 关系，而不是卡片列表。；主操作：选节点 → Evidence/Case → Return 回同一图位置。；移动：纵向事件路径 + Evidence 节点，保存 zoom/focus。； 所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。

PDF Task 映射 • 055–063 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
65	LUNA-054	LUNA	CTH-04 | 事件关系：Backend / Binding 闭合	R10	PARTIAL	仅关闭 CTH-04 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前事件存在但真实关系 edge 未供应；先验证 canonical edge owner 与 Evidence。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
66	LUNA-055	LUNA	CTH-04 | 事件关系：App UI / UX 实现	R10	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-04 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：事件因果星图 + 时间轴；节点表达 Event/Case/Evidence 关系，而不是卡片列表。；主交互完成： 选节点 → Evidence/Case → Return 回同一图位置。；mobile 重组：纵向事件路径 + Evidence 节点，保存 zoom/focus。 ；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
67	LUNA-056	LUNA	CTH-04 | 事件关系：Acceptance / E2E 证据	R10	ABSENT	独立验证 CTH-04 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
68	SOL-057	SOL	CTH-05 | 情绪日历：Screen Spec 闭合	R10	ABSENT	把 CTH-05 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：日历热场表达日期的事件/情绪密度，并明确数据可用性与色阶。；主操作：选日/区间 → 事件与来源；键盘可切 list view。；移动：周/日 agenda + 密度标记 + Evidence 列表。；所有字段/动作有 source 或 明确 BLOCKED。
69	LUNA-058	LUNA	CTH-05 | 情绪日历：Backend / Binding 闭合	R10	PARTIAL	仅关闭 CTH-05 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	保留 daily source；修复 read error → 0，逐日绑定 Subject/source record。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
70	LUNA-059	LUNA	CTH-05 | 情绪日历：App UI / UX 实现	R10	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-05 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：日历热场表达日期的事件/情绪密度，并明确数据可用性与色阶。；主交互完成：选日/区间 → 事件 与来源；键盘可切 list view。；mobile 重组：周/日 agenda + 密度标记 + Evidence 列表。；状态/Trace/Return/keyboa rd/touch/semantics 完整。
71	LUNA-060	LUNA	CTH-05 | 情绪日历：Acceptance / E2E 证据	R10	ABSENT	独立验证 CTH-05 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
72	SOL-061	SOL	CTH-06 | 负面监测与反馈：Screen Spec 闭合	R10	ABSENT	把 CTH-06 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：将舆情、用户反馈、已确认事件分流为 triage queue；source-first 阅读。；主操作：核验 Source → 分类/关联 Case → 保留原始措辞与 lineage。；移动：Review 卡片栈 + 全屏 source reader。；所有字段 /动作有 source 或 明确 BLOCKED。
73	LUNA-062	LUNA	CTH-06 | 负面监测与反馈：Backend / Binding 闭合	R10	PARTIAL	仅关闭 CTH-06 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	映射真实 note 字段，不得把 note 重命名成 Case；Case/Evidence 只走 canonical owner。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。

PDF Task 映射 • 064–072 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
74	LUNA-063	LUNA	CTH-06 | 负面监测与反馈：App UI / UX 实现	R10	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-06 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：将舆情、用户反馈、已确认事件分流为 triage queue；source-first 阅读。；主交互完成：核验 So urce → 分类/关联 Case → 保留原始措辞与 lineage。；mobile 重组：Review 卡片栈 + 全屏 source reader。；状态/Tr ace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
75	LUNA-064	LUNA	CTH-06 | 负面监测与反馈：Acceptance / E2E 证据	R10	ABSENT	独立验证 CTH-06 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
76	SOL-065	SOL	CTH-07 | 趋势分析：Screen Spec 闭合	R10	ABSENT	把 CTH-07 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：同步时间序列 + metric definition + comparison overlay + delta decomposition。；主操作：添加兼容 metric/cohort → 看 delta 贡献与 Evidence。；移动：单主图 + 横向 metric switcher + delta 解释 。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
77	LUNA-066	LUNA	CTH-07 | 趋势分析：Backend / Binding 闭合	R10	PARTIAL	仅关闭 CTH-07 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	修复 daily aggregate 的 error-to-zero；补 Subject/freshness/Evidence。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
78	LUNA-067	LUNA	CTH-07 | 趋势分析：App UI / UX 实现	R10	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-07 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：同步时间序列 + metric definition + comparison overlay + delta decomposition。；主交互完成：添加兼容 metric/cohort → 看 delta 贡献与 Evidence。；mobile 重组：单主图 + 横向 metric switcher + delta 解 释。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
79	LUNA-068	LUNA	CTH-07 | 趋势分析：Acceptance / E2E 证据	R10	ABSENT	独立验证 CTH-07 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
80	SOL-069	SOL	CTH-08 | 案例与知识库：Screen Spec 闭合	R11	ABSENT	把 CTH-08 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Open Case 生命周期与 verified knowledge shelf 分开；Case timeline 不等于知识。；主操作：授权状态迁移；reviewed conclusion 才能晋升 knowledge。；移动：Case inbox + 步进 timeline。；所有字段/ 动作有 source 或明确 BLOCKED。
81	LUNA-070	LUNA	CTH-08 | 案例与知识库：Backend / Binding 闭合	R11	PARTIAL	仅关闭 CTH-08 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前 high-risk/event 不是 canonical Case；先绑定 Case owner、ID、state、lifecycle。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
82	LUNA-071	LUNA	CTH-08 | 案例与知识库：App UI / UX 实现	R11	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-08 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Open Case 生命周期与 verified knowledge shelf 分开；Case timeline 不等于知识。；主交互完 成：授权状态迁移；reviewed conclusion 才能晋升 knowledge。；mobile 重组：Case inbox + 步进 timeline。；状态/Tr ace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。

PDF Task 映射 • 073–081 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
83	LUNA-072	LUNA	CTH-08 | 案例与知识库：Acceptance / E2E 证据	R11	ABSENT	独立验证 CTH-08 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
84	SOL-073	SOL	CTH-09 | 风险与决策板：Screen Spec 闭合	R11	ABSENT	把 CTH-09 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Risk register 与 Decision ledger 对齐，Evidence 与 Action owner 同行展示。；主操作：看 basis → 记录 Decision → 请求审批 → 确认 Action。；移动：风险流 + Decision detail + 明确确认。；所有 字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
85	LUNA-074	LUNA	CTH-09 | 风险与决策板：Backend / Binding 闭合	R11	PARTIAL	仅关闭 CTH-09 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	Risk 可复用但 Decision owner/API 当前缺失；不得自行创造第二套 Decision。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
86	LUNA-075	LUNA	CTH-09 | 风险与决策板：App UI / UX 实现	R11	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-09 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Risk register 与 Decision ledger 对齐，Evidence 与 Action owner 同行展示。；主交互完成： 看 basis → 记录 Decision → 请求审批 → 确认 Action。；mobile 重组：风险流 + Decision detail + 明确确认。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
87	LUNA-076	LUNA	CTH-09 | 风险与决策板：Acceptance / E2E 证据	R11	ABSENT	独立验证 CTH-09 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
88	SOL-077	SOL	CTH-10 | 报告与周报：Screen Spec 闭合	R11	ABSENT	把 CTH-10 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Report storyboard：结论、上下文、drivers、Evidence、方法与 scope；不是 Dashboard 截图。；主操作：选 period/block → 核验 source → preview/export。；移动：章节列表 → 单页预览 → export sheet。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
89	LUNA-078	LUNA	CTH-10 | 报告与周报：Backend / Binding 闭合	R11	PARTIAL	仅关闭 CTH-10 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前 report/Evidence 跨 scope；先在现有 owner 加 Subject/product filters 和 export Permission。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
90	LUNA-079	LUNA	CTH-10 | 报告与周报：App UI / UX 实现	R11	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 CTH-10 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Report storyboard：结论、上下文、drivers、Evidence、方法与 scope；不是 Dashboard 截图。； 主交互完成：选 period/block → 核验 source → preview/export。；mobile 重组：章节列表 → 单页预览 → export sheet。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
91	LUNA-080	LUNA	CTH-10 | 报告与周报：Acceptance / E2E 证据	R11	ABSENT	独立验证 CTH-10 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。

PDF Task 映射 • 082–090 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
92	SOL-081	SOL	BMP-01	品牌市场总览：Screen Spec 闭合	R09	PARTIAL	把 BMP-01 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：品牌中心关系场：audience/creator/channel/competitor 作为市场作用力，不能复用 CTH 时间线。；主操作：聚焦 BrandFocus → 看关系 Evidence → 进入 market/propagation/campaign。；移动：brand pulse + 关系轮播 + source trace。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
93	LUNA-082	LUNA	BMP-01	品牌市场总览：Backend / Binding 闭合	R09	PARTIAL	仅关闭 BMP-01 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	必须先得到可信 actor + authorized BrandFocus + Evidence lineage，产品级 ZBMP 聚合不能当选中品牌。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E 。
94	LUNA-083	LUNA	BMP-01	品牌市场总览：App UI / UX 实现	R09	PARTIAL	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-01 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：品牌中心关系场：audience/creator/channel/competitor 作为市场作用力，不能复用 CTH 时间线。 ；主交互完成：聚焦 BrandFocus → 看关系 Evidence → 进入 market/propagation/campaign。；mobile 重组：brand pulse + 关系轮播 + source trace。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
95	LUNA-084	LUNA	BMP-01	品牌市场总览：Acceptance / E2E 证据	R09	PARTIAL	独立验证 BMP-01 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以 “页面能渲染” 作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
96	SOL-085	SOL	BMP-02	品牌组合与竞品：Screen Spec 闭合	R12	ABSENT	把 BMP-02 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Owned brand 与 competitor 的 portfolio constellation；类别与身份围绕品牌。；主操作：比较/聚焦品牌；context switch 显式并可 Return。；移动：搜索 portfolio → brand profile → competitor chip s。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
97	LUNA-086	LUNA	BMP-02	品牌组合与竞品：Backend / Binding 闭合	R12	PARTIAL	仅关闭 BMP-02 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 curated directory；真实品牌指标必须来自 BrandFocus scoped canonical BMP source。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
98	LUNA-087	LUNA	BMP-02	品牌组合与竞品：App UI / UX 实现	R12	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-02 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Owned brand 与 competitor 的 portfolio constellation；类别与身份围绕品牌。；主交互完成： 比较/聚焦品牌；context switch 显式并可 Return。；mobile 重组：搜索 portfolio → brand profile → competitor chips。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
99	LUNA-088	LUNA	BMP-02	品牌组合与竞品：Acceptance / E2E 证据	R12	ABSENT	独立验证 BMP-02 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以 “页面能渲染” 作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
100	SOL-089	SOL	BMP-03	市场情报：Screen Spec 闭合	R12	ABSENT	把 BMP-03 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：机会雷达按主题 momentum 与 evidence confidence 组织；选中信号旁是 source brief。；主操作：过滤市场窗口 → 看 provenance → 标记待复核 lead。；移动：机会 feed + source reader。；所有字段/动 作有 source 或明确 BLOCKED。

PDF Task 映射 • 091–099 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
101	LUNA-090	LUNA	BMP-03 | 市场情报：Backend / Binding 闭合	R12	PARTIAL	仅关闭 BMP-03 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前 intelligence_assets 跨 scope；在现有 owner 过滤 domain/brand 并附 item Evidence。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
102	LUNA-091	LUNA	BMP-03 | 市场情报：App UI / UX 实现	R12	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-03 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：机会雷达按主题 momentum 与 evidence confidence 组织；选中信号旁是 source brief。；主交互 完成：过滤市场窗口 → 看 provenance → 标记待复核 lead。；mobile 重组：机会 feed + source reader。；状态/Trace /Return/keyboard/touch/semantics 完整。
103	LUNA-092	LUNA	BMP-03 | 市场情报：Acceptance / E2E 证据	R12	ABSENT	独立验证 BMP-03 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
104	SOL-093	SOL	BMP-04 | 媒体传播分析：Screen Spec 闭合	R12	ABSENT	把 BMP-04 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：channel → content → exposure → response 的传播河流与统一时间窗。；主操作：追踪 campaign/content → 看每个平台 source、metric 定义、freshness。；移动：纵向 funnel + channel selector + metric/source detail。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
105	LUNA-094	LUNA	BMP-04 | 媒体传播分析：Backend / Binding 闭合	R12	PARTIAL	仅关闭 BMP-04 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	现有 brand_propagation 读无 BrandFocus 且 GET 可有 schema side effect；先做 side-effect-free scoped read。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
106	LUNA-095	LUNA	BMP-04 | 媒体传播分析：App UI / UX 实现	R12	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-04 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：channel → content → exposure → response 的传播河流与统一时间窗。；主交互完成：追踪 campaign/content → 看每个平台 source、metric 定义、freshness。；mobile 重组：纵向 funnel + channel selector + metric/source detail。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
107	LUNA-096	LUNA	BMP-04 | 媒体传播分析：Acceptance / E2E 证据	R12	ABSENT	独立验证 BMP-04 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
108	SOL-097	SOL	BMP-05 | 创作者生态：Screen Spec 闭合	R12	ABSENT	把 BMP-05 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：KOS/KOL/KOC/UGC creator graph，按 audience fit、真实性、贡献、风险；辅以审计表。；主操作：打开 creator dossier → 比较贡献 → 记录风险/加入授权 campaign。；移动：creator cards + dossier detail。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
109	LUNA-098	LUNA	BMP-05 | 创作者生态：Backend / Binding 闭合	R12	PARTIAL	仅关闭 BMP-05 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 profile；加 BrandFocus scope 与 canonical content/conversion/Evidence link。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。

PDF Task 映射 • 100–108 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
110	LUNA-099	LUNA	BMP-05	创作者生态：App UI / UX 实现	R12	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-05 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：KOS/KOL/KOC/UGC creator graph，按 audience fit 、真实性、贡献、风险；辅以审计表。；主交互 完成：打开 creator dossier → 比较贡献 → 记录风险/加入授权 campaign。；mobile 重组：creator cards + dossier d etail。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
111	LUNA-100	LUNA	BMP-05	创作者生态：Acceptance / E2E 证据	R12	ABSENT	独立验证 BMP-05 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
112	SOL-101	SOL	BMP-06	内容中心：Screen Spec 闭合	R13	ABSENT	把 BMP-06 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Brief/Draft/Review/Approved/Scheduled/Delivered 的编辑生产板；版本绑定 rights/provenance。；主操作：上传/版本化 → Review lineage/approval → 请求 publish handoff。；移动：生产队列 + versio n stack + approval actions。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
113	LUNA-102	LUNA	BMP-06	内容中心：Backend / Binding 闭合	R13	PARTIAL	仅关闭 BMP-06 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前 content Evidence 全局；先通过 Evidence owner 做 scope，错误不能假装 empty。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
114	LUNA-103	LUNA	BMP-06	内容中心：App UI / UX 实现	R13	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-06 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Brief/Draft/Review/Approved/Scheduled/Delivered 的编辑生产板；版本绑定 rights/provenance 。；主交互完成：上传/版本化 → Review lineage/approval → 请求 publish handoff。；mobile 重组：生产队列 + vers ion stack + approval actions。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
115	LUNA-104	LUNA	BMP-06	内容中心：Acceptance / E2E 证据	R13	ABSENT	独立验证 BMP-06 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
116	SOL-105	SOL	BMP-07	Campaign 工作区：Screen Spec 闭合	R13	ABSENT	把 BMP-07 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：objective → audience → channel mix → milestones → outcome；Goal 与 Actual 两条轨分开。；主操作：建/改计划 → owner/date → approval → delivery → evaluation。；移动：引导式 milestones + 紧凑 objective/status。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
117	LUNA-106	LUNA	BMP-07	Campaign 工作区：Backend / Binding 闭合	R13	PARTIAL	仅关闭 BMP-07 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前仅 quota/cooldown 过程状态；goals/timeline/ROI/Evidence 需 canonical campaign source。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
118	LUNA-107	LUNA	BMP-07	Campaign 工作区：App UI / UX 实现	R13	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-07 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：objective → audience → channel mix → milestones → outcome；Goal 与 Actual 两条轨分开 。；主交互完成：建/改计划 → owner/date → approval → delivery → evaluation。；mobile 重组：引导式 milestone s + 紧凑 objective/status。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。

PDF Task 映射 • 109–117 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
119	LUNA-108	LUNA	BMP-07 | Campaign 工作区：Acceptance / E2E 证据	R13	ABSENT	独立验证 BMP-07 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
120	SOL-109	SOL	BMP-08 | 播客工作室：Screen Spec 闭合	R13	ABSENT	把 BMP-08 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：音频优先：waveform + timecoded script + research source + speaker cues。；主操作：从 approved brief/Evidence 起稿 → 对齐 transcript/audio → claims review → versioned export。；移动：tran script-first + scrub controls + source drawer。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
121	LUNA-110	LUNA	BMP-08 | 播客工作室：Backend / Binding 闭合	R13	PARTIAL	仅关闭 BMP-08 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 podcast owner；去 GET schema writes，加 BrandFocus filter，保留 Evidence IDs。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
122	LUNA-111	LUNA	BMP-08 | 播客工作室：App UI / UX 实现	R13	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-08 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：音频优先：waveform + timecoded script + research source + speaker cues。；主交互完成：从 approved brief/Evidence 起稿 → 对齐 transcript/audio → claims review → versioned export。；mobile 重组：tra nscript-first + scrub controls + source drawer。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
123	LUNA-112	LUNA	BMP-08 | 播客工作室：Acceptance / E2E 证据	R13	ABSENT	独立验证 BMP-08 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
124	SOL-113	SOL	BMP-09 | 品牌评估：Screen Spec 闭合	R13	ABSENT	把 BMP-09 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：维度 scorecard + period movement + confidence + Evidence coverage，叙事结论在 measured values 之后。；主操作：选品牌/period → 看 definition/Evidence → 只比较 aligned baseline。；移动：维 度优先级列表 + 单选 Evidence trend。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
125	LUNA-114	LUNA	BMP-09 | 品牌评估：Backend / Binding 闭合	R13	PARTIAL	仅关闭 BMP-09 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 evaluation owner；read init 安全、brand scope、Evidence ref 不可丢。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
126	LUNA-115	LUNA	BMP-09 | 品牌评估：App UI / UX 实现	R13	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-09 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：维度 scorecard + period movement + confidence + Evidence coverage，叙事结论在 measured va lues 之后。；主交互完成：选品牌/period → 看 definition/Evidence → 只比较 aligned baseline。；mobile 重组：维 度优先级列表 + 单选 Evidence trend。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
127	LUNA-116	LUNA	BMP-09 | 品牌评估：Acceptance / E2E 证据	R13	ABSENT	独立验证 BMP-09 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。

PDF Task 映射 • 118–126 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
128	SOL-117	SOL	BMP-10 | 品牌风险与事件：Screen Spec 闭合	R13	ABSENT	把 BMP-10 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：按 severity/spread/recency 组织品牌 incident；active event timeline 连接 response owner。；主操作：triage → assign response → approval/effect → revisit impact。；移动：urgent queue + incident detail + action ladder。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
129	LUNA-118	LUNA	BMP-10 | 品牌风险与事件：Backend / Binding 闭合	R13	PARTIAL	仅关闭 BMP-10 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前错误复用 CTH Subject 风险；必须切回 BMP canonical Brand/Market risk owner。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
130	LUNA-119	LUNA	BMP-10 | 品牌风险与事件：App UI / UX 实现	R13	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-10 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：按 severity/spread/recency 组织品牌 incident；active event timeline 连接 response owner。；主交互完成：triage → assign response → approval/effect → revisit impact。；mobile 重组：urgent queue + incident detail + action ladder。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
131	LUNA-120	LUNA	BMP-10 | 品牌风险与事件：Acceptance / E2E 证据	R13	ABSENT	独立验证 BMP-10 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
132	SOL-121	SOL	BMP-11 | Benchmark 与竞品分析：Screen Spec 闭合	R13	ABSENT	把 BMP-11 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：normalized comparison workbench：定义、并排品牌/竞品、Evidence strip，不可比值直接 withheld。；主操作：选择 comparison set/window → 看 normalization → supported gap → export。；移动：可 滑动比较 + sticky metric definition。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
133	LUNA-122	LUNA	BMP-11 | Benchmark 与竞品分析：Backend / Binding 闭合	R13	PARTIAL	仅关闭 BMP-11 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 benchmark owner；scope 到 selected Brand/market + Evidence 后才显示 ranking。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
134	LUNA-123	LUNA	BMP-11 | Benchmark 与竞品分析：App UI / UX 实现	R13	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 BMP-11 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：normalized comparison workbench：定义、并排品牌/竞品、Evidence strip，不可比值直接 withheld。；主交互完成：选择 comparison set/window → 看 normalization → supported gap → export。；mobile 重组：可 滑动比较 + sticky metric definition。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
135	LUNA-124	LUNA	BMP-11 | Benchmark 与竞品分析：Acceptance / E2E 证据	R13	ABSENT	独立验证 BMP-11 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
136	SOL-125	SOL	AI-01 | AI 意图入口：Screen Spec 闭合	R09	PARTIAL	把 AI-01 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：单一 intent composer + 当前产品上下文/Evidence preview；建议任务必须来自可用能力。；主操作：输入 task → 确认 context/plan → executable 时才 start。；移动：单 prompt + context chip + expandable plan。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。

PDF Task 映射 • 127–135 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
137	LUNA-126	LUNA	AI-01 | AI 意图入口：Backend / Binding 闭合	R09	PARTIAL	仅关闭 AI-01 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	保留 ai_intent + PermissionGate；先绑定可信 actor/context；provider configured/idle/offline 分开。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E 。
138	LUNA-127	LUNA	AI-01 | AI 意图入口：App UI / UX 实现	R09	PARTIAL	在 backend contract 已可信后，实现 AI-01 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：单一 intent composer + 当前产品上下文/Evidence preview；建议任务必须来自可用能力。；主交 互完成：输入 task → 确认 context/plan → executable 时才 start。；mobile 重组：单 prompt + context chip + exp andable plan。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
139	LUNA-128	LUNA	AI-01 | AI 意图入口：Acceptance / E2E 证据	R09	PARTIAL	独立验证 AI-01 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
140	SOL-129	SOL	AI-02 | 能力任务工作台：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 AI-02 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：可取消 stages + 阶段间 artifact；每个 transition 暴露 Evidence 与 Permission 要求。；主操作：start/pause/cancel/retry safe stage；gated action 必须 review。；移动：纵向 progress path + pers istent cancel + Evidence expand。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
141	LUNA-130	LUNA	AI-02 | 能力任务工作台：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 AI-02 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 execution owner；先增加 actor/product-scoped read，writes 仍走 effect boundary。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
142	LUNA-131	LUNA	AI-02 | 能力任务工作台：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 AI-02 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：可取消 stages + 阶段间 artifact；每个 transition 暴露 Evidence 与 Permission 要求。；主交 互完成：start/pause/cancel/retry safe stage；gated action 必须 review。；mobile 重组：纵向 progress path + per sistent cancel + Evidence expand。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
143	LUNA-132	LUNA	AI-02 | 能力任务工作台：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 AI-02 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
144	SOL-133	SOL	AI-03 | Evidence 锚定分析线程：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 AI-03 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：按结论组织 claim；每个 claim 内联 Evidence anchor、uncertainty、provenance rail。；主操作：开 source relevant passage → challenge/refine claim → follow-up task。；移动：claim cards + inli ne citations + full-screen source return。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
145	LUNA-134	LUNA	AI-03 | Evidence 锚定分析线程：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 AI-03 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	conversation store 当前不存在；Evidence 还跨 scope。先定义 thread scope/retention，再做 execution→Evidence join。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；accept ance 仍需 UI/E2E。

PDF Task 映射 • 136–144 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
146	LUNA-135	LUNA	AI-03 | Evidence 锚定分析线程：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 AI-03 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：按结论组织 claim；每个 claim 内联 Evidence anchor、uncertainty、provenance rail。；主交互 完成：开 source relevant passage → challenge/refine claim → follow-up task。；mobile 重组：claim cards + inl ine citations + full-screen source return。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
147	LUNA-136	LUNA	AI-03 | Evidence 锚定分析线程：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 AI-03 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
148	SOL-137	SOL	AI-04 | Agent 与 Skill 目录：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 AI-04 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：能力矩阵只展示 owner、任务、permission、health、last verified call；代码存在不等于可用。；主操作：按任务 filter → 看 I/O/permission → 运行 verified safe capability。；移动：可搜索 capabil ity list + detail sheet。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
149	LUNA-138	LUNA	AI-04 | Agent 与 Skill 目录：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 AI-04 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	绑定 canonical SkillRegistry，不用旧 FUNCTION_MAP 作为最终 truth；registration 与 health 分开。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
150	LUNA-139	LUNA	AI-04 | Agent 与 Skill 目录：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 AI-04 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：能力矩阵只展示 owner、任务、permission、health、last verified call；代码存在不等于可用。；主交互完成：按任务 filter → 看 I/O/permission → 运行 verified safe capability。；mobile 重组：可搜索 capab ility list + detail sheet。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
151	LUNA-140	LUNA	AI-04 | Agent 与 Skill 目录：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 AI-04 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
152	SOL-141	SOL	AI-05 | AI Gateway 与 Providers：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 AI-05 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Provider topology 表示 availability/latency/policy/fallback，Rules/Data 保持核心主线。；主操作：看 provider state 或 diagnostic；fallback 可观察且不阻塞核心业务。；移动：provider list + fal lback/last-check。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
153	LUNA-142	LUNA	AI-05 | AI Gateway 与 Providers：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 AI-05 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 AI Gateway status；readiness 必须来自真实 probe，unknown/offline 保留。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
154	LUNA-143	LUNA	AI-05 | AI Gateway 与 Providers：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 AI-05 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Provider topology 表示 availability/latency/policy/fallback，Rules/Data 保持核心主线。；主交互完成：看 provider state 或 diagnostic；fallback 可观察且不阻塞核心业务。；mobile 重组：provider list + f allback/last-check。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。

PDF Task 映射 • 145–153 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
155	LUNA-144	LUNA	AI-05 | AI Gateway 与 Providers：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 AI-05 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
156	SOL-145	SOL	SYS-01 | Runtime 健康：Screen Spec 闭合	R09	PARTIAL	把 SYS-01 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：App → API → DB → Adapter 的运行 topology，显示 degradation 与 check time。；主操作：开 failing dependency diagnostic；authorized recovery 才可执行。；移动：ordered dependency list + focused diagnostic。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
157	LUNA-146	LUNA	SYS-01 | Runtime 健康：Backend / Binding 闭合	R09	PARTIAL	仅关闭 SYS-01 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	现有 RuntimeGuardian read slice 可用；补 SYSTEM actor Permission，null/offline 不能变 healthy。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
158	LUNA-147	LUNA	SYS-01 | Runtime 健康：App UI / UX 实现	R09	PARTIAL	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-01 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：App → API → DB → Adapter 的运行 topology，显示 degradation 与 check time。；主交互完成：开 failing dependency diagnostic；authorized recovery 才可执行。；mobile 重组：ordered dependency list + focused diagnostic。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
159	LUNA-148	LUNA	SYS-01 | Runtime 健康：Acceptance / E2E 证据	R09	PARTIAL	独立验证 SYS-01 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
160	SOL-149	SOL	SYS-02 | Collector 状态：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-02 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：platform lanes 展示 scheduler/rate-limit/retry/backoff/queue/ingestion stage。；主操作：看 run → retry/stop（若允许）→ trace collected record。；移动：platform queue cards + running/retry 状态。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
161	LUNA-150	LUNA	SYS-02 | Collector 状态：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-02 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 collector status owner；验证 health semantics 与 operator access。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
162	LUNA-151	LUNA	SYS-02 | Collector 状态：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-02 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：platform lanes 展示 scheduler/rate-limit/retry/backoff/queue/ingestion stage。；主交互完成：看 run → retry/stop（若允许）→ trace collected record。；mobile 重组：platform queue cards + running/retry 状态。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
163	LUNA-152	LUNA	SYS-02 | Collector 状态：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-02 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。

PDF Task 映射 • 154–162 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
164	SOL-153	SOL	SYS-03	数据库与 Truth Chain：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-03 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：schema/version/integrity 分层连接 source → canonical → evidence → metric。；主操作：检查 table/chain validation → 精确 integrity error；recovery 独立授权。；移动：chain stages + integri ty summary + error detail。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
165	LUNA-154	LUNA	SYS-03	数据库与 Truth Chain：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-03 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 canonical_data self_check/schema versions；加 SYSTEM reader auth，healthy/failed/unknown 分明。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E 2E。
166	LUNA-155	LUNA	SYS-03	数据库与 Truth Chain：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-03 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：schema/version/integrity 分层连接 source → canonical → evidence → metric。；主交互完成：检查 table/chain validation → 精确 integrity error；recovery 独立授权。；mobile 重组：chain stages + integr ity summary + error detail。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
167	LUNA-156	LUNA	SYS-03	数据库与 Truth Chain：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-03 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
168	SOL-157	SOL	SYS-04	安全与权限：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-04 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：actor × product/domain × operation/risk 的 Permission matrix + 独立 audit trail。；主操作：模拟/读取 access decision → reason；真正 approve 只走真实二因子/审批。；移动：role/scope list + decision detail。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
169	LUNA-158	LUNA	SYS-04	安全与权限：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-04 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前只是 enums，不是 Permission decision；绑定真实 permission callable。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
170	LUNA-159	LUNA	SYS-04	安全与权限：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-04 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：actor × product/domain × operation/risk 的 Permission matrix + 独立 audit trail。；主交 互完成：模拟/读取 access decision → reason；真正 approve 只走真实二因子/审批。；mobile 重组：role/scope list + decision detail。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
171	LUNA-160	LUNA	SYS-04	安全与权限：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-04 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
172	SOL-161	SOL	SYS-05	设置与外观：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-05 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：密度/对比度/语言/motion 的 preference studio，只影响 presentation，不改 business data。；主操作：改 preference → preview → save/reset → 明确 persisted scope。；移动：分组设置页 + 实时无 障碍 preview。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。

PDF Task 映射 • 163–171 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
173	LUNA-162	LUNA	SYS-05	设置与外观：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-05 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前仅 local preference；保持 local 或由 Sol 明确 adoption 后才引入 canonical settings persistence。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E 2E。
174	LUNA-163	LUNA	SYS-05	设置与外观：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-05 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：密度/对比度/语言/motion 的 preference studio，只影响 presentation，不改 business data。；主交互完成：改 preference → preview → save/reset → 明确 persisted scope。；mobile 重组：分组设置页 + 实时无 障碍 preview。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
175	LUNA-164	LUNA	SYS-05	设置与外观：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-05 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
176	SOL-165	SOL	SYS-06	内部浏览器：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-06 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：受控 Evidence capture workspace：source page、capture metadata、audit action 三者分明。；主操作：navigate allowed target → pin snapshot as Evidence → inspect audit。；移动：source full-sc reen + metadata/trace panel。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
177	LUNA-166	LUNA	SYS-06	内部浏览器：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-06 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 Browser Surface；actor/session/target 需安全授权，并保留 session provenance。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
178	LUNA-167	LUNA	SYS-06	内部浏览器：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-06 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：受控 Evidence capture workspace：source page、capture metadata、audit action 三者分明。；主交互完成：navigate allowed target → pin snapshot as Evidence → inspect audit。；mobile 重组：source full-s creen + metadata/trace panel。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
179	LUNA-168	LUNA	SYS-06	内部浏览器：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-06 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
180	SOL-169	SOL	SYS-07	评估与验收：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-07 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：六道 acceptance gate 展示 owner/evidence/result/blocker；PARTIAL/UNKNOWN 明确未完成。；主操作：开 gate artifact → rerun permitted check → 看 exact criterion。；移动：sequential gate cards + blocker + artifact links。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
181	LUNA-170	LUNA	SYS-07	评估与验收：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-07 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	security posture 与 runtime health 分开；绑定 current checks + authorized operator。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。

PDF Task 映射 • 172–180 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
182	LUNA-171	LUNA	SYS-07	评估与验收：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-07 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：六道 acceptance gate 展示 owner/evidence/result/blocker；PARTIAL/UNKNOWN 明确未完成。；主 交互完成：开 gate artifact → rerun permitted check → 看 exact criterion。；mobile 重组：sequential gate card s + blocker + artifact links。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
183	LUNA-172	LUNA	SYS-07	评估与验收：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-07 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
184	SOL-173	SOL	SYS-08	可观测性与日志：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SYS-08 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：trace waterfall 关联 request/span/structured error；prototype events 独立 lane。；主操作：按 trace/time/component filter → 相关 logs → Return originating runtime/task。；移动：trace summa ry + spans/errors。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
185	LUNA-174	LUNA	SYS-08	可观测性与日志：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SYS-08 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	保留 sanitized logs；加 SYSTEM auth 与 provenance。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
186	LUNA-175	LUNA	SYS-08	可观测性与日志：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SYS-08 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操 作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：trace waterfall 关联 request/span/structured error；prototype events 独立 lane。；主交互 完成：按 trace/time/component filter → 相关 logs → Return originating runtime/task。；mobile 重组：trace sum mary + spans/errors。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
187	LUNA-176	LUNA	SYS-08	可观测性与日志：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SYS-08 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
188	SOL-177	SOL	SH-01	内容创作工作室：Screen Spec 闭合	R09	PARTIAL	把 SH-01 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Source/Brief/Evidence → editable artifact → version/outcome；Artifact 是中心。；主操作：真实 brief 起草 → cite Evidence → review → human approval handoff。；移动：focused editor + sour ce drawer + version/action sheet。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
189	LUNA-178	LUNA	SH-01	内容创作工作室：Backend / Binding 闭合	R09	PARTIAL	仅关闭 SH-01 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	当前只安全实现 capability catalog；Studio/Pattern/Fact Wall/thread 缺口与 publish effect 需逐 owner 关闭。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍 需 UI/E2E。
190	LUNA-179	LUNA	SH-01	内容创作工作室：App UI / UX 实现	R09	PARTIAL	在 backend contract 已可信后，实现 SH-01 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作 ，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Source/Brief/Evidence → editable artifact → version/outcome；Artifact 是中心。；主交互 完成：真实 brief 起草 → cite Evidence → review → human approval handoff。；mobile 重组：focused editor + s o urce drawer + version/action sheet。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。

PDF Task 映射 • 181–189 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
191	LUNA-180	LUNA	SH-01 | 内容创作工作室：Acceptance / E2E 证据	R09	PARTIAL	独立验证 SH-01 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
192	SOL-181	SOL	SH-02 | Evidence Library：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SH-02 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：搜索优先 Evidence atlas，按 source/time/domain/lineage；snapshot 与 citation 相邻。；主操作：search/filter → 对照 source/extract → 看 freshness → 回 owning CTH/BMP。；移动：Evidence cards + full-screen source trace。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
193	LUNA-182	LUNA	SH-02 | Evidence Library：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SH-02 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	现有 Evidence query/stats 全局；必须 actor/domain scoped 并逐 row validate。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
194	LUNA-183	LUNA	SH-02 | Evidence Library：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SH-02 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：搜索优先 Evidence atlas，按 source/time/domain/lineage；snapshot 与 citation 相邻。；主交互完成：search/filter → 对照 source/extract → 看 freshness → 回 owning CTH/BMP。；mobile 重组：Evidence cards + full-screen source trace。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
195	LUNA-184	LUNA	SH-02 | Evidence Library：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SH-02 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
196	SOL-185	SOL	SH-03 | Canonical Data 与 Metrics 浏览：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SH-03 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：schema/metric explorer 分开 definition/owner/lineage/sample；derived 标识清楚。；主操作：选 field/metric → traverse lineage；只读，不编辑 business fact。；移动：metric list + definition + lineage drilldown。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
197	LUNA-186	LUNA	SH-03 | Canonical Data 与 Metrics 浏览：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SH-03 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	global canonical counts 不能直接给 App；先做 authorized product/domain filtering + Evidence lineage。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/ E2E。
198	LUNA-187	LUNA	SH-03 | Canonical Data 与 Metrics 浏览：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SH-03 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：schema/metric explorer 分开 definition/owner/lineage/sample；derived 标识清楚。；主交互完成：选 field/metric → traverse lineage；只读，不编辑 business fact。；mobile 重组：metric list + definition + lineage drilldown。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
199	LUNA-188	LUNA	SH-03 | Canonical Data 与 Metrics 浏览：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SH-03 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。

PDF Task 映射 • 190–198 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
200	SOL-189	SOL	SH-04	报告导出中心：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SH-04 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：configuration / preview / completed artifact / failed export 分状态；旁边展示 provenance。；主操作：选支持格式 → scope → preview → export → audited artifact。；移动：guided export + fin al artifact view。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
201	LUNA-190	LUNA	SH-04	报告导出中心：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SH-04 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	保留 report catalog；export 必须绑定 Permission + approval/effect fence + audit/Evidence。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
202	LUNA-191	LUNA	SH-04	报告导出中心：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SH-04 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：configuration / preview / completed artifact / failed export 分状态；旁边展示 provenance 。；主交互完成：选支持格式 → scope → preview → export → audited artifact。；mobile 重组：guided export + final artifact view。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
203	LUNA-192	LUNA	SH-04	报告导出中心：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SH-04 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
204	SOL-193	SOL	SH-05	学习与评估资产：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SH-05 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：verified SOP/retrospective/training/evaluation 与 draft 分开；provenance/review date 可见。；主操作：打开 asset → verification history → propose revision / cited task input。；移动：filte red library + reading view。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。
205	LUNA-194	LUNA	SH-05	学习与评估资产：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SH-05 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	复用 learning owner；加 domain/origin scope 与 lineage。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
206	LUNA-195	LUNA	SH-05	学习与评估资产：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SH-05 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：verified SOP/retrospective/training/evaluation 与 draft 分开；provenance/review date 可见 。；主交互完成：打开 asset → verification history → propose revision / cited task input。；mobile 重组：filter ed library + reading view。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
207	LUNA-196	LUNA	SH-05	学习与评估资产：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SH-05 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
208	SOL-197	SOL	SH-06	通知与任务：Screen Spec 闭合	R14	ABSENT	把 SH-06 的用户问题、entry/return、PC/mobile composition、真实 fields/actions、state matrix、permission/evidence、acceptance 全部收敛成可施工 Spec。	Spec 明确：Approval / owned task / alert / info subscription 分 urgency lanes，带 source context。；主操作：triage/assign/snooze/resolve 走授权 action；Return origin。；移动：priority queue + full-scr een task action。；所有字段/动作有 source 或明确 BLOCKED。

PDF Task 映射 • 199–207 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
209	LUNA-198	LUNA	SH-06	通知与任务：Backend / Binding 闭合	R14	PARTIAL	仅关闭 SH-06 依赖的真实后端 binding：复用 canonical owner，把 scope/Permission/Evidence/state 绑定完整；不做 UI。	TaskEngine 保持 SYSTEM；operator read 要 scope，queue/offline/error 状态保真。；成功/空/未采集/离线/拒绝/错误可区分；binding registry 有当前 source evidence；acceptance 仍需 UI/E2E。
210	LUNA-199	LUNA	SH-06	通知与任务：App UI / UX 实现	R14	ABSENT	在 backend contract 已可信后，实现 SH-06 的 purpose-built Flutter Experience。用户只看到任务、内容、结果与操作，系统内部 owner/tool/evidence contract 退到产品背后。	PC 与 mobile 均表达：Approval / owned task / alert / info subscription 分 urgency lanes，带 source context。；主交互完成：triage/assign/snooze/resolve 走授权 action；Return origin。；mobile 重组：priority queue + full-sc reen task action。；状态/Trace/Return/keyboard/touch/semantics 完整。
211	LUNA-200	LUNA	SH-06	通知与任务：Acceptance / E2E 证据	R14	ABSENT	独立验证 SH-06 的真实用户任务，从 App action 到 API/Permission/Canonical/Evidence/result/Return，不以“页面能渲染”作为完成。	Widget/API/integration 至少全绿；关键 responsive widths；blocked/error/retry/Trace/Return；需要 live 的标为 LIVE_VERIFIED 或明确未验证。
212	SOL-201	SOL	Internal Beta Critical Journey 最终冻结	R15	BLOCKED	在全部核心 Screen slice 就绪后，冻结 beta 的真实关键旅程、设备、数据源、账号/媒体 session、失败恢复与验收证据。	每条 journey 有 start state、真实 source、action、Evidence、result、return/evaluation、failure/recovery、device。
213	LUNA-202	LUNA	CTH Source→Evidence→Event→Case→Decision→Action 闭环	R15	BLOCKED	用真实允许数据跑 CTH critical journey，证明 Subject scope、Evidence trace、Case/Decision/Action 与 Return/Evaluation。	入口到结果完整；失败/权限拒绝/离线恢复可重放；Evidence 可回源。
214	LUNA-203	LUNA	BMP BrandFocus→Market→Content/Creator→Campaign→Evaluation 闭环	R15	BLOCKED	跑 BMP 核心旅程，证明 BrandFocus、市场/传播/创作者/内容/Campaign/评估的 scope 与 Evidence。	BrandFocus 全程保持；每个分析可 Trace；Campaign result 与 baseline 分开；evaluation 有 lineage。
215	LUNA-204	LUNA	AI Intent→Task→Evidence→Artifact→Action→Evaluation 闭环	R15	BLOCKED	用真实 AI Gateway/Agent runtime 跑 artifact-first 流程；不得用 chat UI 替代。	task 有 execution id、real stage、Evidence、artifact、gated action、evaluation；provider fallback 可观察。
216	LUNA-205	LUNA	Shared Creation / Report / Export 闭环	R15	BLOCKED	证明 brief/evidence→artifact→review/approval→export 与 lineage；publish 在无真实 publisher 时保持 blocked。	至少一个真实 artifact 与一个 audited export 完成；失败/blocked 状态诚实。
217	LUNA-206	LUNA	SYSTEM 故障→诊断→恢复→Return 闭环	R15	BLOCKED	制造受控可恢复故障，证明 runtime/collector/browser/db/logs 的诊断、Permission、恢复与状态回归。	故障被检测、定位、恢复；用户回到原任务；audit/log 完整。

PDF Task 映射 • 208–216 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
218	LUNA-207	LUNA	XHS/RedNote Cookie Session LIVE 验收	R15	BLOCKED	在授权本地环境验证 media Cookie/session + HK collector 的真实 collection→Evidence→Canonical，不泄露凭据。	session health、collection、provenance、Evidence、canonicalization、failure isolation 均有 live evidence。
219	LUNA-208	LUNA	Offline / Partial / Stale / Permission-denied 全 App 回归	R15	BLOCKED	验证关键 journeys 在网络断开、部分数据、陈旧数据、403/401、collector offline 下不撒谎且可恢复。	关键状态均有真实 UI + semantics + recovery；Return context 保持。
220	LUNA-209	LUNA	Security / Permission / Effect Boundary Beta Gate	R15	BLOCKED	验证所有 consequential action 经过 Permission→Approval→Effect Fence，denied/pending 无副作用。	权限矩阵、拒绝、审批、外部 effect audit 全通过；secret scan 无泄漏。
221	LUNA-210	LUNA	DB Backup / Migration / Rollback Gate	R15	BLOCKED	用隔离 DB/production-candidate copy 验证 migration、backup、rollback、schema integrity，不修改受保护 production DB。	migrate/rollback/restore 可重复；canonical/Evidence 数据不丢；schema owner 唯一。
222	LUNA-211	LUNA	Desktop 真实设备 Experience Gate	R15	BLOCKED	在 Windows/macOS 至少覆盖 1920/1440/1280/1024/768，跑 critical journeys、键盘/focus、resize、恢复。	无 overflow/blocked controls；keyboard/focus/return/long text 正常；真实 API journey 完成。
223	LUNA-212	LUNA	Mobile 真实设备 Experience Gate	R15	BLOCKED	在 Android/iOS 至少覆盖 430/390/360，验证 touch、back、interrupt/resume、offline、长文本。	critical journey 在真实设备完成；返回/恢复正确；无横向溢出。
224	LUNA-213	LUNA	Accessibility + Reduced Motion Gate	R15	BLOCKED	全关键 screen 验证 keyboard/focus order、screen reader semantics、contrast、touch target、reduced motion。	关键操作无鼠标可完成；动态状态有 announcement；reduced motion 不丢信息。
225	LUNA-214	LUNA	Performance / Resource / Long-run Stability Gate	R15	BLOCKED	验证 App+Core+collector 长时间运行不出现明显内存/任务堆积/重复 supervisor/队列失控。	长跑期间 health 可观测；无重复 runtime；queue/retry/backoff 在界限内。
226	LUNA-215	LUNA	Tier A/B Clean Checkout Full Gate	R15	BLOCKED	在干净 clone 运行所有 blocking repository/hermetic tests 和 Flutter gate，证明不是开发机偶然通过。	Product Gate + App Gate 对当前 commit 真实 GREEN。

PDF Task 映射 • 217–225 / 225

原 Task 全保留；源码状态与多表面增量在对应 Round 重新验收。

PDF	Task	Owner	Title	R	Source	Goal	Completion gate
227	LUNA-216	LUNA	Tier C Production/Live Acceptance Gate	R15	BLOCKED	在满足 prerequisites 的授权环境运行 environment/live suites，补齐 A/B 无法证明的 browser/session/real data/recovery。	所有 beta critical prerequisites 有 dated live evidence；未跑项明确 blocker。
228	SOL-217	SOL	Internal Beta GO / NO-GO Review	R15	BLOCKED	根据 current commit 的 ACCEPTED screens、critical journeys、Tier A/B/C、security/recovery 证据决定是否进入 internal beta。	输出 GO 或 NO-GO + 明确 blockers；无排名式模糊语言。
229	SOL-218	SOL	Post-beta Account / Access Product Decision	R15	BLOCKED	在 internal beta 后再决定 ACC-01~04 的正式 LUMENIS account/SSO/access recovery 产品范围与 rollout。	Account scope、SSO、roles/recovery/permission contract 被批准或明确后置。
230	LUNA-219	LUNA	Post-beta ACC-01~04 Production Binding / E2E	R15	BLOCKED	按 Sol 决策把 ACC screens 从 fail-closed/selection-only 完成到真实 product account/access flows，并跑 E2E。	ACC flows 实际可用；授权 context 切换与恢复真实；不破坏 pre-beta verified workflows。
231	LUNA-220	LUNA	Compatibility Caller 最终吸收与删除	R15	BLOCKED	依据 LUNA-004/SOL-005 矩阵，在所有能力已迁移/验收后删除明确 redundant compatibility callers/legacy paths。	root compatibility 显著下降；所有删除有 replacement owner + regression；Only-One guards PASS。
232	LUNA-221	LUNA	Documentation / Intelligence Library 去重与权威边界	R15	BLOCKED	把 docs/intelligence_library 中重复/历史材料标记为 provenance 或去重，确保只有 CURRENT Product/Experience authority 能驱动开发。	重复文档有 canonical pointer 或清理；legacy Z-Brand 文档不再误导当前开发。
233	LUNA-222	LUNA	Cross-platform Release Build Matrix	R15	BLOCKED	生成并验证 Windows/macOS/Linux/Android/iOS candidate build，版本/签名/配置/网络权限/启动行为一致。	所有目标可 build；至少目标内测平台可安装/启动/连接 Core；版本号与 artifact trace 可追。
234	LUNA-223	LUNA	Release Candidate Clean Clone + Fresh Data Smoke	R15	BLOCKED	从全新 clone 安装依赖、启动 Core/App、用新隔离/候选数据跑最短 critical smoke，排除本机残留依赖。	fresh clone 可复现；health、App launch、一个 CTH/BMP/AI smoke 成功或真实 fail closed。
235	SOL-224	SOL	最终产品闭环验收	R15	BLOCKED	对 current release candidate 做最终产品级验收：Only One、App-only、44 screens 状态、critical journeys、truth/permission/evidence、平台、recovery、release evidence。	明确列出 ACCEPTED/DEFERRED/BLOCKED；若 release，则每个声明都能追到当前 commit + evidence。

APPROVED EXECUTION BASELINE

ROUND 01 已批准；下一独立任务进入 ROUND 02

本 PDF 是覆盖与规划证据，不是设计权威、实现完成或发布声明。

What is protected

PRESERVE

现有源码、未知本地运行态、root callers、兼容层、数据库、Evidence、Permission、Skill Store 后端资产与所有未证明已迁移的能力。

What will happen next

SEQUENTIAL

重新 resolve 当前 SHA → 发出 ROUND 02 Charter → 仅派发第一张 bounded Luna Task Card → Sol 读取 BASE/FINAL SHA、diff、tests、runtime/E2E、blockers → PASS/REWORK/BLOCKED/SPLIT/REORDER → 停止。

Current stop

ROUND BOUNDARY

本执行基线已获 Product Owner 批准。ROUND 02 与序境09仍未在本治理固化任务中启动；下一独立 Sol 任务必须重新解析当前 SHA、工作树、依赖与保护项。
